

# Appendiks

## Retningslinjer

Alle igangværende statslige it-projekter<sup>1</sup> med projektudgifter på 10 mio. kr. eller derover indberetter halvårligt deres status til Statens It-råd.

Særligt tre målbare parametre er interessante i denne sammenhæng: Forventede projektudgifter, tidsplan og projektets økonomiske rentabilitet (her angivet ved nettonutidsværdien<sup>2</sup>). Disse tre parametre vurderes for hvert enkelt projekt på baggrund af nedenstående kriterier.

<b>PROJEKTUDGIFTER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: red;">■</span> forventes overskredet mere end 10 pct. eller 6 mio. kr. ift. baseline.</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> forventes overskredet op til 10 pct. eller 6 mio. kr. ift. baseline.</li> <li><span style="color: green;">■</span> forventes ingen overskridelser.</li> </ul>
<b>TIDSPLAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: red;">■</span> forventes forsinket mere end 3 måneder ift. baseline.</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> forventes forsinket 1 til 3 måneder ift. baseline.</li> <li><span style="color: green;">■</span> forventes forsinket højst 1 måned ift. baseline.</li> </ul>
<b>NETTONUTIDSVÆRDI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: red;">■</span> forventes at blive mindre end 90 pct. af baseline.</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> forventes at blive 90-95 pct. af baseline.</li> <li><span style="color: green;">■</span> forventes at blive mindst 95 pct. af baseline.</li> </ul>

I forlængelse af disse tre parametre præsenterer appendikset også to andre parametre som indgår i den samlede vurdering af hvert enkelt projekt. De to parametre er projektets bruttogevinster og ikke-økonomiske gevinster.

Alle indberettede beløb, inklusiv baseline, er justeret til 2018-priser. Det understreges, at den samlede status for projektet er en helhedsvurdering fra Statens It-råd, der bygger på flere faktorer end ovennævnte.


Alle informationer om projekterne i dette appendiks er videregivet som indberettet af myndighederne.

<sup>1</sup> Fortrolige projekter indgår ikke i appendikset.

<sup>2</sup> Nettonutidsværdien er beregnet som nutidsværdien af de økonomiske gevinster fratrukket projektudgifterne. Nutidsværdien af fremtidige udgifter og økonomiske gevinster beregnes ved at diskontere med 4 pct. pr. år, hvilket er fastsat af Finansministeriet. Projektet er økonomisk rentabelt ved en nettonutidsværdi større end 0.

## Læsevejledning

### Projektudgifter og nettonutidsværdi

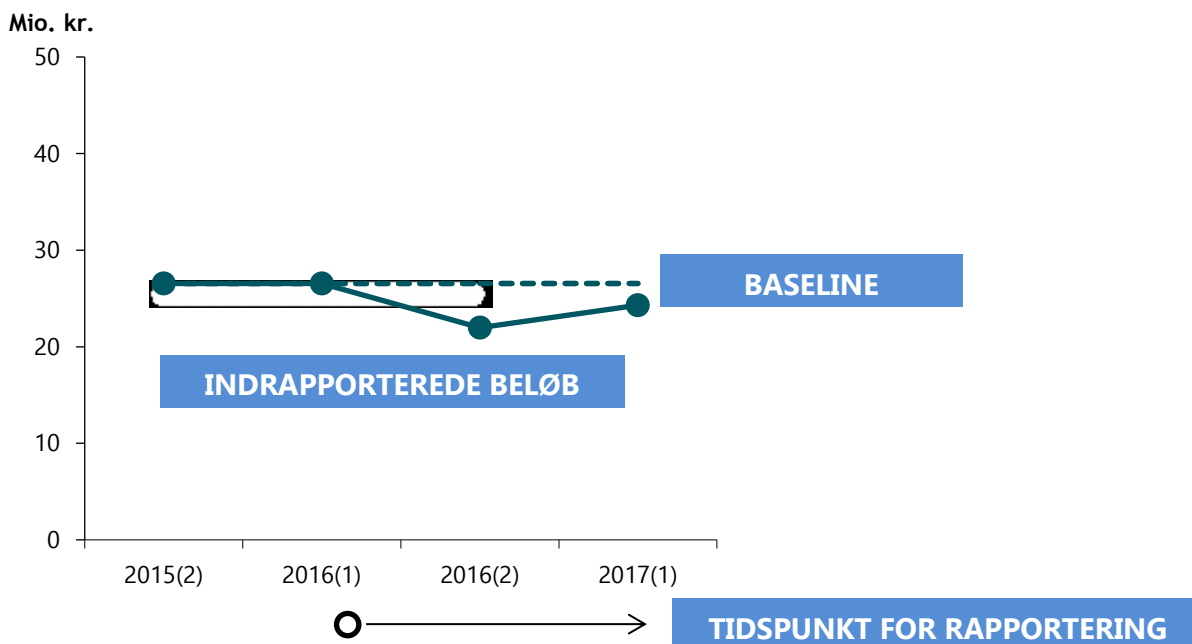





### Projektafslutning

**TIDSPUNKT FOR RAPPORTERING**

PROJEKT-AFSLUTNING	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	-	-	-	30-06-2017 (baseline)	30-06-2017	30-06-2017	01-07-2017	22-12-2018 (ny baseline)

**FORVENTET DATO FOR PROJEKTAFSLUTNING**

<b>PROJEKTETS NAVN</b>	<b>Advanced Passenger Information (PNR/API)</b>
<b>SAMLET TRAFIKLYS</b>	
<b>MYNDIGHED</b>	Rigspolitiet, Justitsministeriet
<b>PROJEKTETS FORMÅL</b>	Kvalitetsløft
<b>BESKRIVELSE</b>	Projektet er afledt af regeringens ønske om at implementere PNR-direktivet, som har til hensigt at styrke politiets muligheder for at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet vha. PNR-data, i dansk lovgivning.
<b>NUVÆRENDE FASE</b>	Gennemførelse
<b>PROJEKTUDGIFTER</b>	<b>41,2 mio. kr.</b>
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen 
<b>PROJEKTAFLUTNING</b>	<b>31. juli 2019</b>
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen 
<b>NETTONUTIDSVÆRDI</b>	<b>-160,4 mio. kr.</b>
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen 
<b>IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER</b>	Projektet har fire ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.


PROJEKTETS  
NAVN

## Advanced Passenger Information (PNR/API)


PROJEKTUDGIFTER

NETTONUTIDSVÆRDI

Mio. kr.

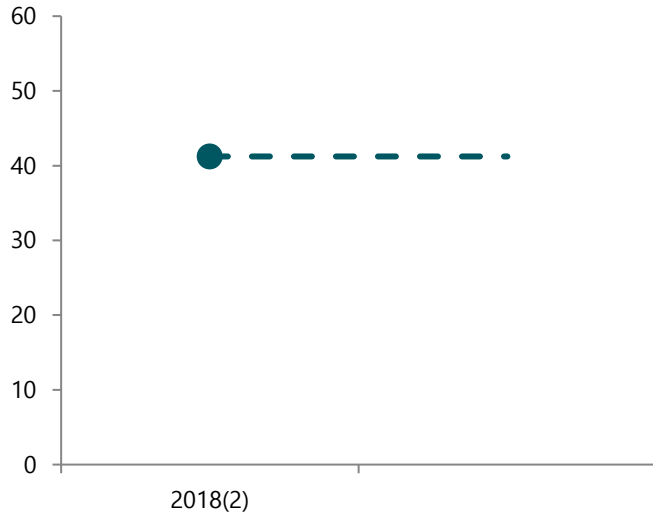

Mio. kr.

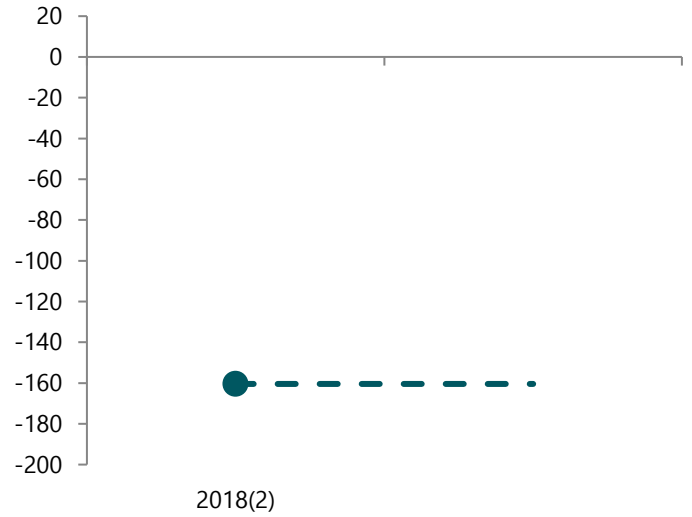

PROJEKT- AFSLUTNING	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	-	-	-	-	-	-	-	31-07-2019

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	-	-	-	-	-	-	-	■

## PROJEKTETS NAVN

**Asset Management**

## SAMLET TRAFIKLYS



## MYNDIGHED

Vejdirektoratet, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

## PROJEKTETS FORMÅL

Effektivisering

## BESKRIVELSE

Projektets formål er at optimere indsatsen på kapitalbevarende vedligehold således at der til stadighed er overblik over ressourcebehov, at der til stadighed kan dokumenteres hvilke forudsætninger der ligger til grund for behovet, samt at det kan dokumenteres i den løbende rapportering hvilke ændringer der finder sted i forhold til indgående aftaler med bevillingsgiver om produktion og tilstand. Kapitalbevarende vedligehold omfatter en række assets og udstyr på vejnettet, hvoraf belægnings- og bygværker er de økonomisk og funktionelt set mest betydende. Anskaffelse af et kommercielt standard/rammesystem, der understøtter integreret Asset Management, vil således sikre en løbende dokumentation af resultaterne herunder sporbarhed og transparens.

## NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

## PROJEKTUDGIFTER

**28,1 mio. kr.**

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



## PROJEKTAFLUTNING

**1. april 2021**

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

13 måneder



## NETTONUTIDSVÆRDI

**-0,8 mio. kr.**

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen

IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER

Projektet har fire ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.


PROJEKTETS  
NAVN

## Asset Management


PROJEKTUDGIFTER

NETTONUTIDSVÆRDI

Mio. kr.

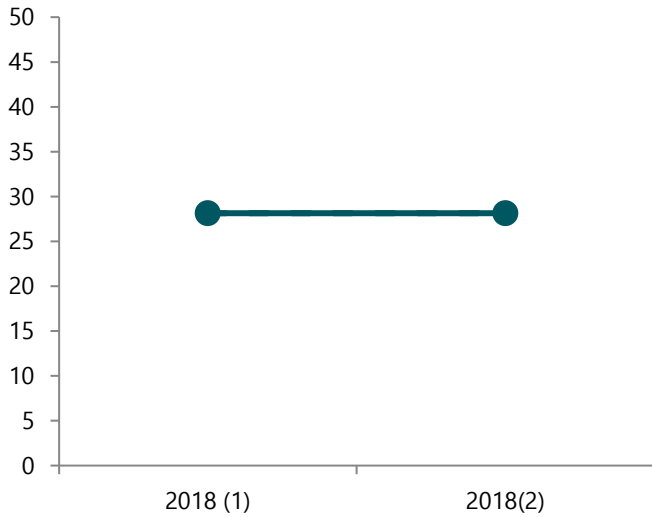

Mio. kr.

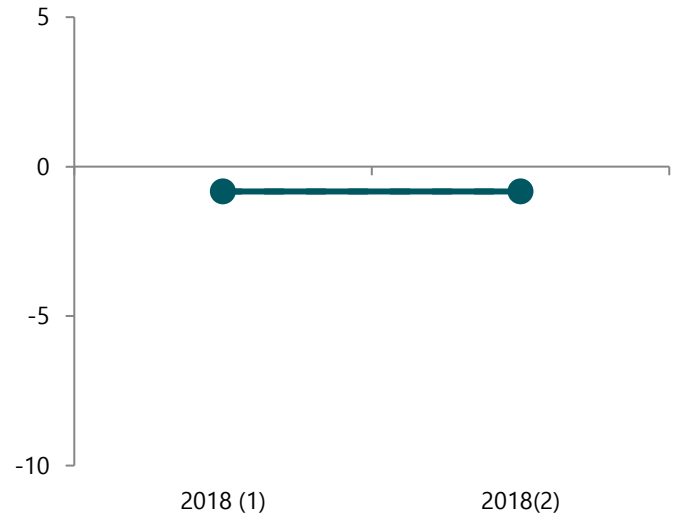

PROJEKT- AFSLUTNING	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	-	-	-	-	-	-	01-03-2020	01-04-2021

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	-	-	-	-	-	-	■	■

## PROJEKTETS NAVN

**Atrium**

## SAMLET TRAFIKLYS



## MYNDIGHED

Bygningsstyrelsen, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

## PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

## BESKRIVELSE

Projektet skal skabe kvalitetsløft ved implementering af fem moduler i det modulopbyggede it-system til ejendomsadministration, Atrium. Projektet skal skabe sammenhæng i Bygningsstyrelsens samlede opgaveportefølje og understøtte en moderne, funktionel og omkostningseffektiv drift og vedligehold af Bygningsstyrelsens samlede ejendomsdispositioner.

## NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

## PROJEKTUDGIFTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**54,0 mio. kr.**

4,9 mio. kr.



## PROJEKTAFSLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**1. januar 2020**

Ingen



## NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**12,5 mio. kr.**


-7,4 mio. kr.

IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER


Projektet har seks ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.

PROJEKTETS NAVN **Atrium**

PROJEKTUDGIFTER

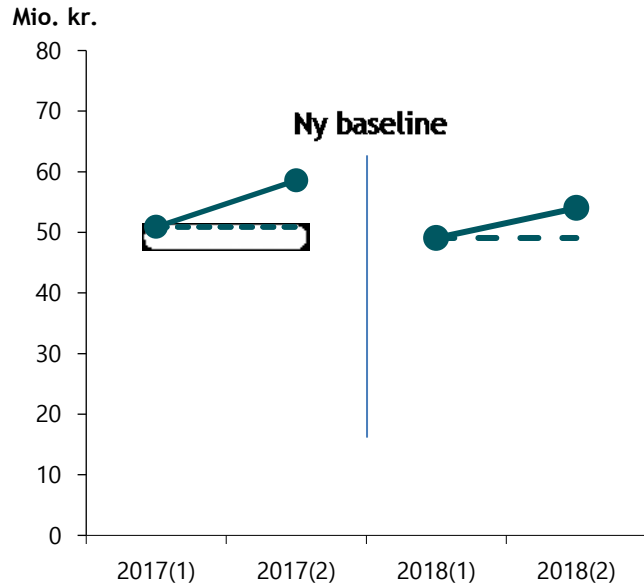

NETTONUTIDSVÆRDI

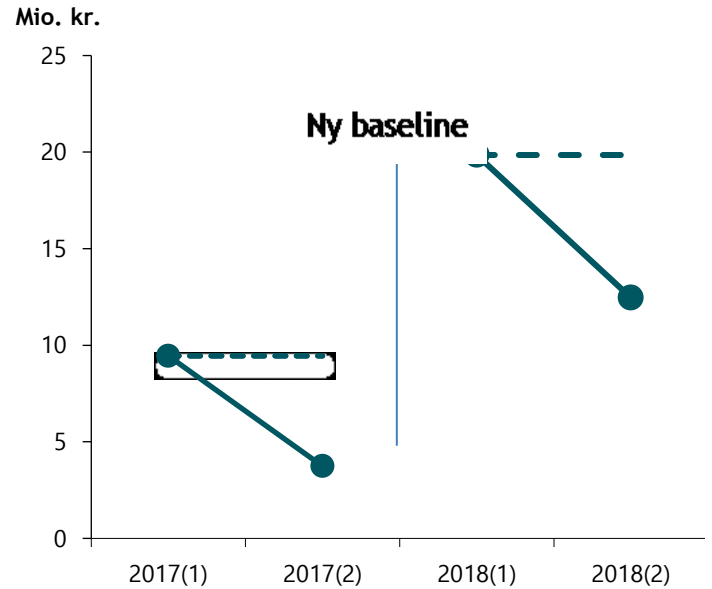

	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
<b>PROJEKT-AFSLUTNING</b>	-	-	-	-	01-01-2020	01-01-2020	01-01-2020 (ny baseline)	01-01-2020
<b>HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS</b>	-	-	-	-	■	■	≡ (ny baseline)	■



## PROJEKTETS NAVN

## CBC (Country by Country)

## SAMLET TRAFIKLYS



## MYNDIGHED

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Skatteministeriet

## PROJEKTETS FORMÅL

Lovgivningsprojekt

## BESKRIVELSE

Projektet etablerer en løsning, der gør at de multinationale koncerner kan overholde deres pligt til at indberette ”land for land-rapporter”, udveksle ”land for land-rapporter” med OECD/EU og USA, samt udstille data til rådighed for indsatsarbejdet i SKAT.

## NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

## PROJEKTUDGIFTER

↓ 36,2 mio. kr.

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

-4,0 mio. kr.



## PROJEKTAFLUTNING

15. februar 2019

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen



## NETTONUTIDSVÆRDI

↑ -34,7 mio. kr.

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

3,8 mio. kr.

IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER

Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, som forventes høstet fuldt ud.


PROJEKTETS  
NAVN

## CBC (Country by Country)


PROJEKTUDGIFTER

NETTONUTIDSVÆRDI

Mio. kr.

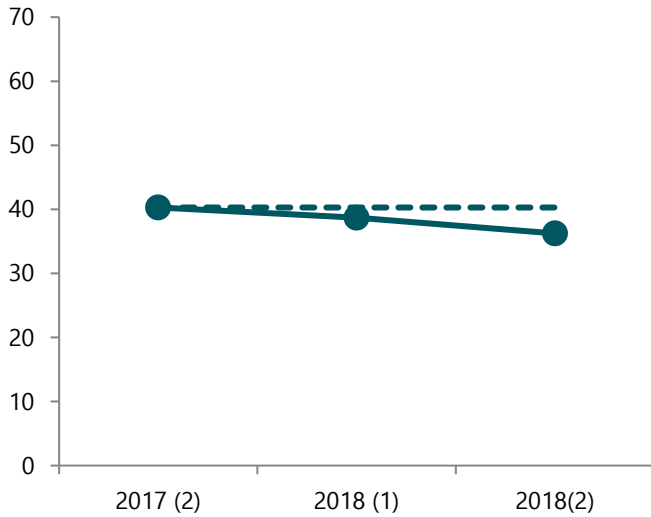

Mio. kr.

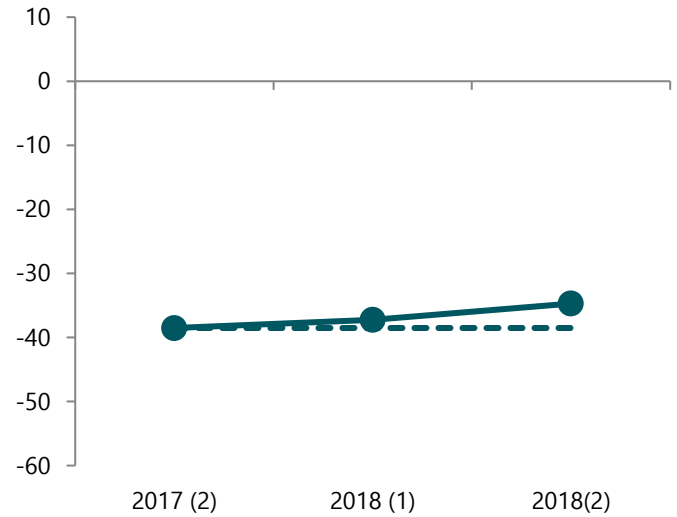

PROJEKT- AFSLUTNING	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	-	-	-	-	-	15-02-2019	15-02-2019	15-02-2019

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	-	-	-	-	-	■	■	■

## PROJEKTETS NAVN

**Domsdatabasen**

## SAMLET TRAFIKLYS



## MYNDIGHED

Domstolsstyrelsen, Justitsministeriet

## PROJEKTETS FORMÅL

Lovgivning

## BESKRIVELSE

Projektets primære formål er knyttet til et politisk ønske om, at der skal etableres en offentligt tilgængelig digital domsdatabase (Domsdatabasen). Der er på denne baggrund vedtaget en lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter af 15. december 2015. Formålet med Domsdatabasen er at tilgodese det grundlæggende princip om offentlighed i retsplejen ved at gøre domme offentligt tilgængelige for enhver i en digital database. Der etableres med Domsdatabasen en gratis adgang for såvel private som erhvervsdrivende og offentlige myndigheder til domme fra Danmarks Domstole med henblik på såvel privat som kommerciel og forskningsmæssig brug af de offentliggjorte domme.

## NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

## PROJEKTUDGIFTER

**Fortroligt pga. udbud**

## AFGIVELSE IFT. BASELINE

Fortroligt 

## PROJEKTAFSLUTNING

**Fortroligt pga. udbud**

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

30 måneder 

## NETTONUTIDSVÆRDI

**Fortroligt pga. udbud**

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER

Projektet har fem ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud

## PROJEKTETS NAVN

**EESSI**

## SAMLET TRAFIKLYS



## MYNDIGHED

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Beskæftigelsesministeriet

## PROJEKTETS FORMÅL

Lovgivning

## BESKRIVELSE

Projektet er en del af EESSI programmet, som foruden knudepunkt og gateway omfatter sagshåndteringssystemet RINA samt fire lokale tilkoblingsprojekter. Projektet EESSI har til formål at etablere et nationalt knudepunkt og tilhørende gateway til udveksling af sociale data mellem sociale sikringsinstitutioner i EU i en standardiseret form. Herudover skal projektet etablere en solid infrastruktur, som sætter danske institutioner i stand til at varetage sagsforvaltning af vandrende arbejdstagere korrekt og bidrage til den tværoffentlige indsats for kontrol af sociale ydelser.

## NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

## PROJEKTUDGIFTER

**18,2 mio. kr.**

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

## PROJEKTAFLUTNING

**1. januar 2020**

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

6 måneder 

## NETTONUTIDSVÆRDI

**-41,5 mio. kr.**


## AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER


Projektet har ingen ikke-økonomiske gevinster.

PROJEKTETS NAVN **EESSI**

PROJEKTUDGIFTER

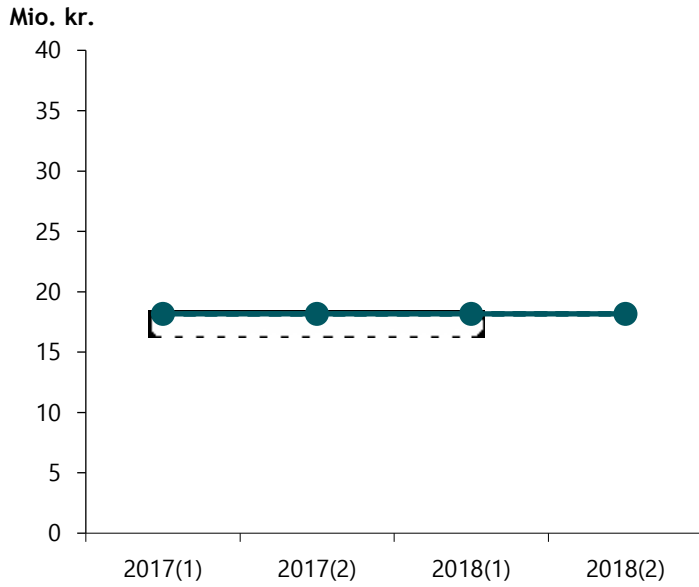

NETTONUTIDSVÆRDI

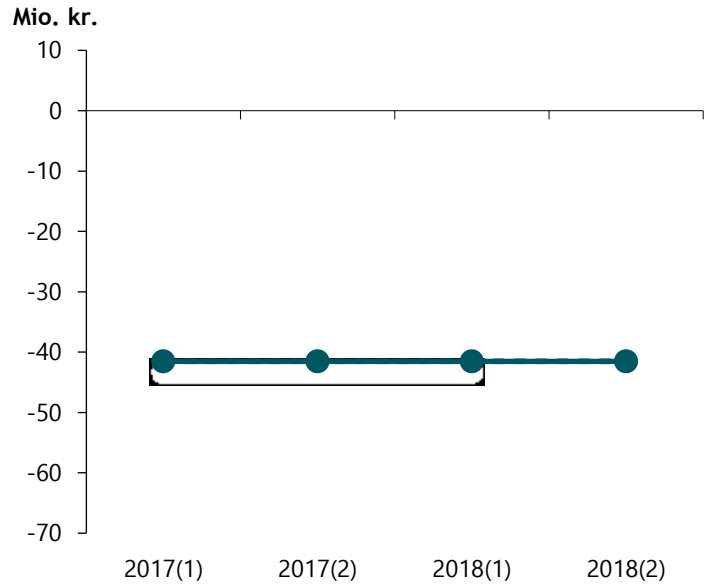

PROJEKT- AFSLUTNING	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	-	-	-	-	01-07-2019	01-07-2019	01-07-2019	01-01-2020

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	-	-	-	-	■	■	■	■

## PROJEKTETS NAVN

**eKapital**

## SAMLET TRAFIKLYS

Afsluttet 1. halvår 2018.

## MYNDIGHED

SKAT, Skatteministeriet

## PROJEKTETS FORMÅL

Lovgivning

## BESKRIVELSE

Projektet har to primære formål: 1) implementering af to aftaler om international udveksling af skatteoplysninger i systemer og processer på eKapitalområdet og 2) omlægning og modernisering af systemer og processer vedrørende indberetning af renteoplysninger fra finansielle sektor til SKAT som følge af skattereformen fra 2012. det sekundære formål er at tilvejebringe en ny teknisk platform på eKapitalområdet.

## NUVÆRENDE FASE

Realisering

## PROJEKTUDGIFTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↓

**129,8 mio. kr.**

-1,3 mio. kr.

## PROJEKTAFSLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**30. juni 2018**

2,5 måneder

## NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑

**-110,5 mio. kr.**

1,3 mio. kr.


IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER

Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, der forventes høstet fuldt ud.


PROJEKTETS NAVN

eKapital

PROJEKTUDGIFTER

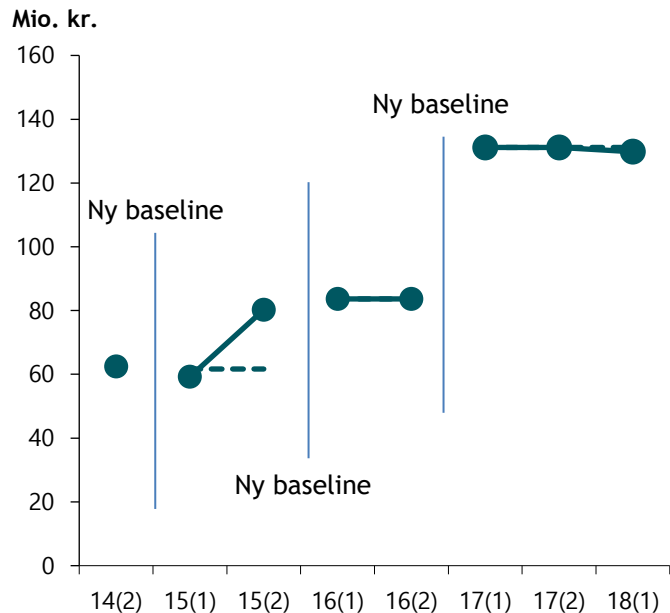

NETTONUTIDSVÆRDI

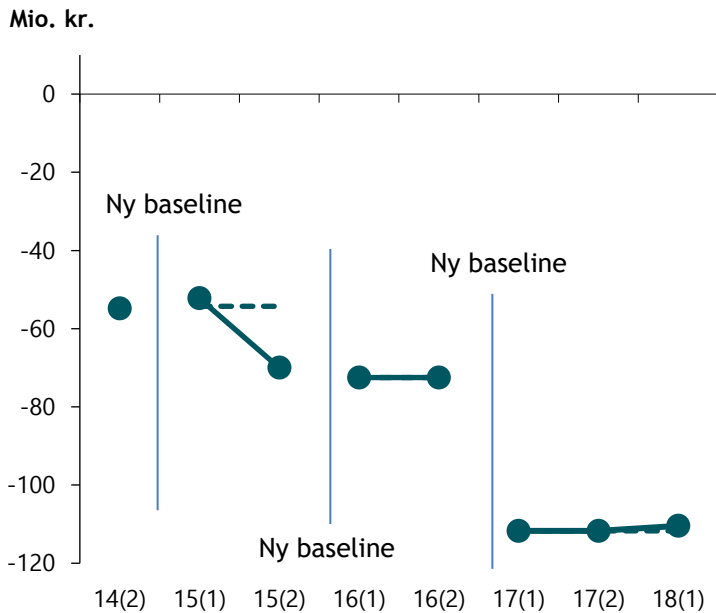

PROJEKT-AFSLUTNING	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	01-03-2017 (baseline)	01-03-2017	01-03-2017	01-06-2017 (ny baseline)	01-06-2017	16-04-2018 (ny baseline)	30-06-2018	30-06-2018 (Afsluttet)	-

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	■ (baseline)	■	■	≡ (ny baseline)	■	≡ (ny baseline)	■	Afsluttet	-

## PROJEKTETS NAVN

**Elektronisk certificering (DIX)**

## SAMLET TRAFIKLYS



## MYNDIGHED

Fødevarestyrelsen, Miljø og Fødevareministeriet

## PROJEKTETS FORMÅL

Effektivisering

## BESKRIVELSE

I dag udfylder og printer eksportørerne selv certifikaterne, som inden eksporten forelægges Fødevarestyrelsen til udstedelse. Selve udstedelsen sker med baggrund i Fødevarestyrelsens kontrol med eksportørens overholdelse af tredjelandskrav. Erhvervet har derfor fremført ønsket om et digitalt system til eksportcertifikater ud fra en forventning om, at et digitalt system kan adressere flere af disse udfordringer. DIX systemet skal være udformet således, at det senere vil være muligt at erstatte papircertifikater og i stedet udstede reelle elektroniske certifikater direkte til tredjelændene.

## NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

## PROJEKTUDGIFTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**Fortroligt pga. udbud**Ingen 

## PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**Fortroligt pga. udbud**Ingen 


## NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**Fortroligt pga. udbud**Ingen IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER

Projektet har 15 ikke-økonomiske gevinster, der forventes høstet fuldt ud.




<b>PROJEKTETS NAVN</b>	<b>ESAS (tidl. Nyt SIS)</b>	
<b>SAMLET TRAFIKLYS</b>		
<b>MYNDIGHED</b>	Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Uddannelses- og Forskningsministeriet	
<b>PROJEKTETS FORMÅL</b>	Effektivisering	
<b>BESKRIVELSE</b>	<p>Med ESAS (tidl. Nyt SIS) stilles et nyt studieadministrativt system til rådighed for studieadministrationen på professionshøjskolerne, erhvervsakademierne og de omfattede maritime uddannelsesinstitutioner. Systemet udgør en del af den samlede it-understøttelse af det studieadministrative område.</p> <p>Funktionaliteten i det nye system vil dække de studieadministrative kerneopgaver og arbejdsprocesser, som institutionerne er pålagt som følge af nationale regler og lovgivning. Målet er at sikre et mere effektivt og sikkert samspil med institutionernes lokale 3. partsystemer. Tilsvarende skal systemet kunne integrere med centrale 3. partsystemer som fx Uddannelsesguiden, Ungedatabasen, Optagelse.dk/KOT, US 2000, CPR-registeret, Navision Stat, CVR, som trækker på eller leverer data til ESAS (tidl. Nyt SIS).</p>	
<b>NUVÆRENDE FASE</b>	Gennemførelse	
<b>PROJEKTUDGIFTER</b>		<b>168,5 mio. kr.</b>
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↓	-11,1 mio. kr.
<b>PROJEKTAFLUTNING</b>		<b>28. februar 2021</b>
AFVIGELSE IFT. BASELINE		Ingen
<b>NETTONUTIDSVÆRDI</b>		<b>19,6 mio. kr.</b>
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑	2,6 mio. kr.
<b>IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER</b>	Projektet har én ikke-økonomisk gevinst, som forventes høstet fuldt ud.	


PROJEKTETS  
NAVN

ESAS (tidl. Nyt SIS)

PROJEKTUDGIFTER

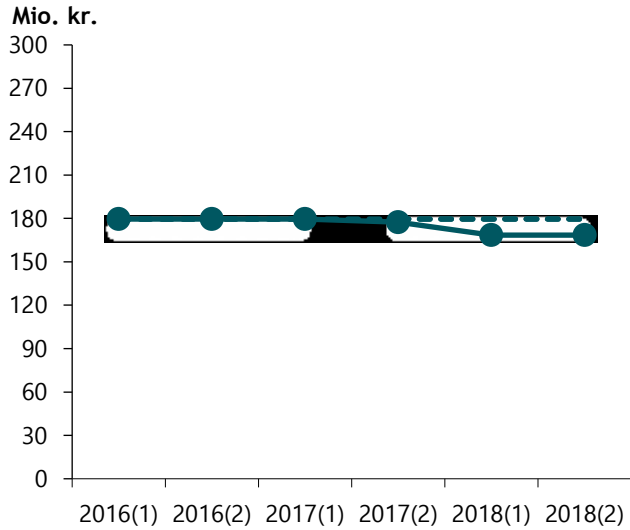

NETTONUTIDSVÆRDI

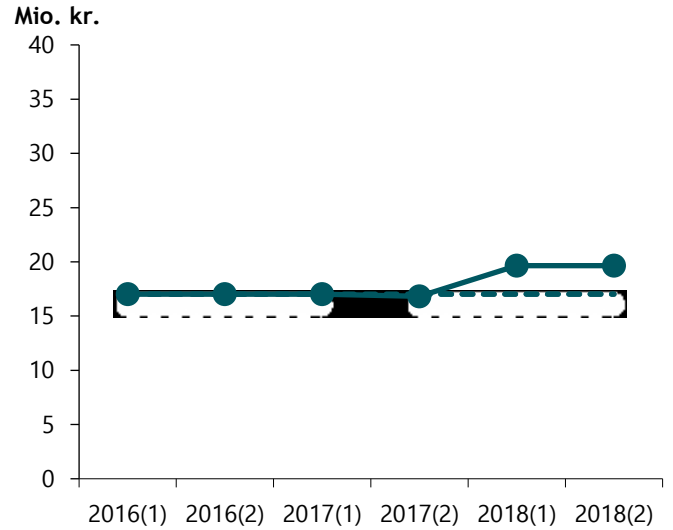

PROJEKT- AFSLUTNING	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	-	-	28-02-2021	28-02-2021	28-02-2021	28-02-2021	28-02-2021	28-02-2021

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	-	-	■	■	■	■	■	■

## PROJEKTETS NAVN

## Fælles biblioteksplatform

## SAMLET TRAFIKLYS



## MYNDIGHED

Det Kongelige Bibliotek, Kulturministeriet

## PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

## BESKRIVELSE

Formålet med etableringen af en fælles biblioteksplatform er at skabe en digital infrastruktur for hele uddannelses- og forskningsbibliotekssektoren i Danmark, samt grundlag for at fælles workflows i det samlede KB bidrager til et kvalitetsløft og effektivisering af bibliotekets funktioner og services. Det Kgl. Biblioteks nuværende bibliotekssystemplatforme er sammensat af en række individuelle moduler og komponenter - alle baseret på primært manuelle arbejdsprocesser med begrænsede integrationsmuligheder. Projektet skal derfor tilvejebringe en tidssvarende, effektiv, fleksibel og skalerbar bibliotekssystemplatform som teknisk fundament for samarbejder og driftsopgaver.

## NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

## PROJEKTUDGIFTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**21,9 mio. kr.**

0,1 mio. kr.



## PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**1. oktober 2019**

Ingen



## NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**6,3 mio. kr.**

2,7 mio. kr.

IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER

Projektet har fem ikke-økonomiske gevinster, der forventes høstet fuldt ud.


PROJEKTETS  
NAVN

## Fælles biblioteksplatform


PROJEKTUDGIFTER

NETTONUTIDSVÆRDI

Mio. kr.

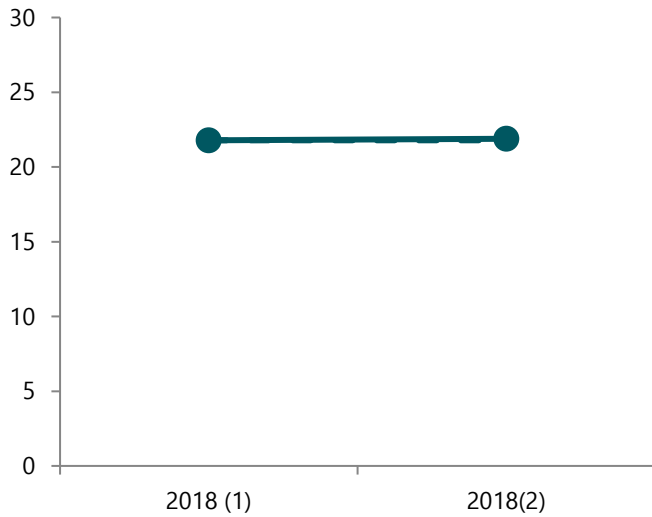

Mio. kr.

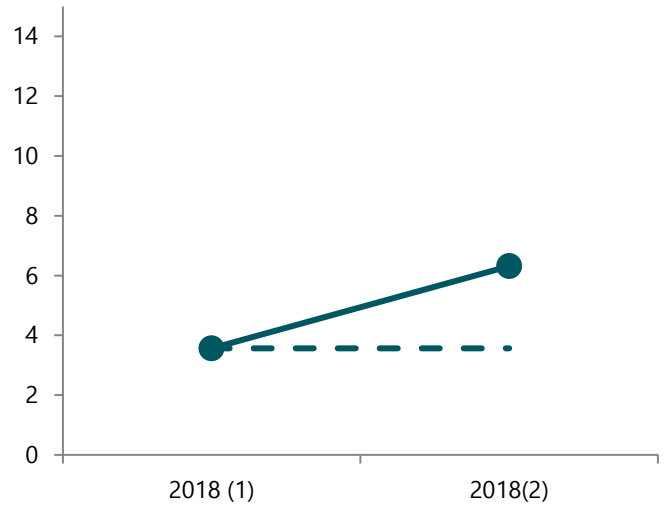

PROJEKT- AFSLUTNING	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	-	-	-	-	-	-	01-10-2019	01-10-2019

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	-	-	-	-	-	-	■	■

## PROJEKTETS NAVN

**Fælles pilotafprøvning**

## SAMLET TRAFIKLYS



## MYNDIGHED

Sundhedsdatastyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet

## PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

## BESKRIVELSE

Projektet skal afprøve leverancerne fra udviklingsprojekterne i programmet og skabe et robust grundlag for udbredelse af programmets løsninger i hele sundhedsdomænet.

## NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

## PROJEKTUDGIFTER

**14,5 mio. kr.**

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

## PROJEKTAFLUTNING

**1. oktober 2019**

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

## NETTONUTIDSVÆRDI

**-13,4 mio. kr.**

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER


Projektet har en ikke-økonomiske gevinster, der forventes høstet fuldt ud.

PROJEKTETS  
NAVN

## Fælles pilotafprøvning


PROJEKTUDGIFTER

Mio. kr.

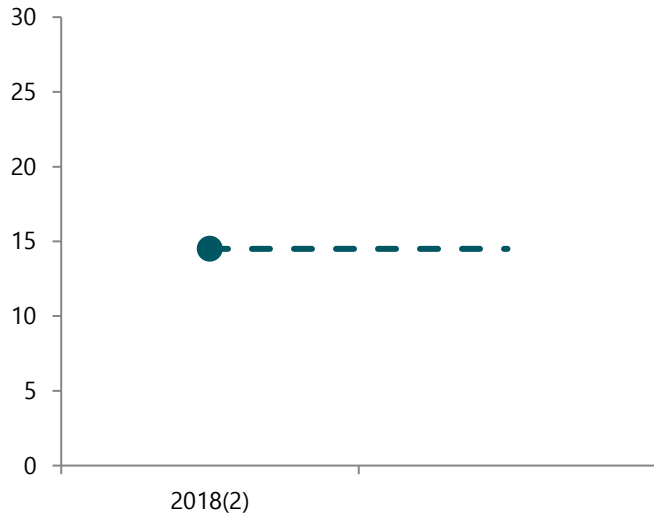

NETTONUTIDSVÆRDI

Mio. kr.

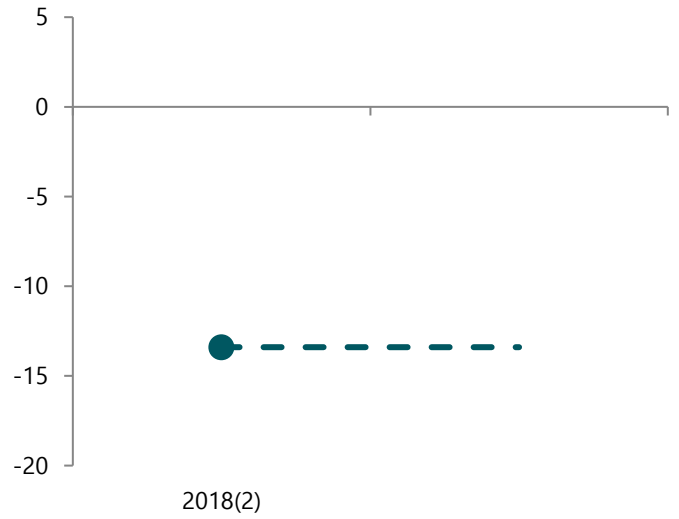

PROJEKT- AFSLUTNING	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	-	-	-	-	-	-	-	01-10-2019

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	-	-	-	-	-	-	-	■

## PROGRAMMETS NAVN

**Grunddataprogrammet**

## SAMLET TRAFIKLYS



## MYNDIGHED

Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet

## PROGRAMMETS FORMÅL

Effektivisering

## BESKRIVELSE

Regeringen og KL besluttede i oktober 2012 at etablere Grunddataprogrammet med henblik på at forbedre de offentlige grunddataregistre og give private aktører fri adgang til grunddata om ejendomme, adresser, vand, klima, geografi, virksomheder og personer.

I 2013 tilsluttede Danske Regioner sig aftalen. Formålet med Grunddataprogrammet er at sikre en effektiv anvendelse af offentlige grunddata gennem forbedret kvalitet, fri adgang og fælles distribution af data. Bedre anvendelse af de offentlige myndigheders data er en vej til betydelige effektiviseringer i det offentlige og til serviceforbedringer til borgere og virksomheder.

## NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

## PROGRAMUDGIFTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**624,8 mio. kr.**

-7,0 mio. kr.



## PROGRAMAFSLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**1. juni 2019**

Ingen



## NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**4.919,9 mio. kr.**


-94,3 mio. kr.

IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER


Projektet har seks ikke-økonomiske gevinster.

PROGRAMMETS NAVN **Grunddataprogrammet**

PROGRAMUDGIFTER

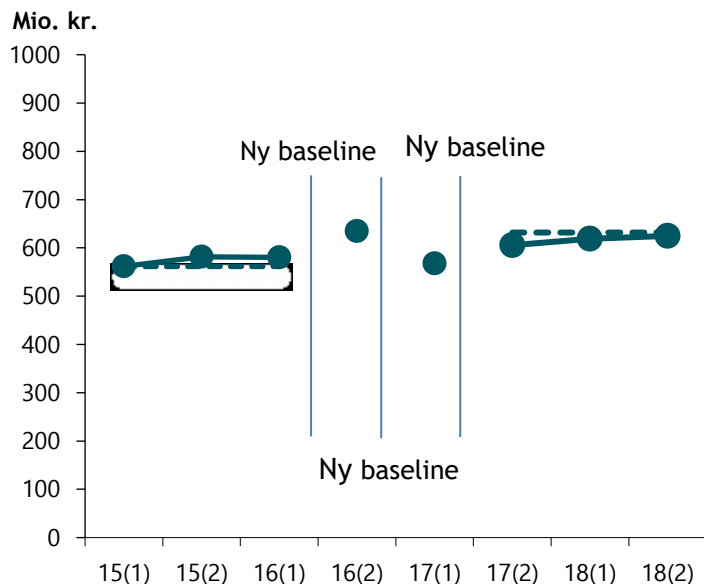

NETTONUTIDSVÆRDI

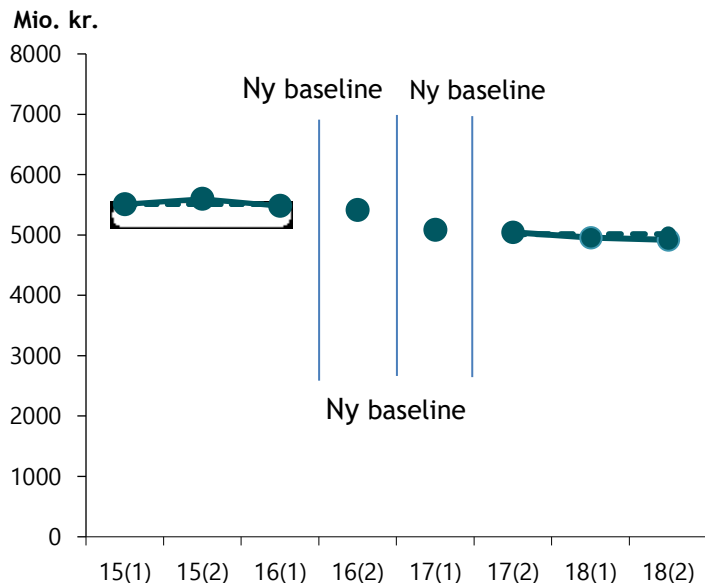

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	■ (baseline)	■	■	■ (ny baseline)	■ (ny baseline)	■ (ny baseline)	■	■

START- OG SLUTTIDSPUNKT FOR DELPROGRAMMER

DELPROGRAM	START	SLUT
GD1: Ejendomsdata	31-12-2012	01-06-2019
GD2: Adressedata	31-12-2012	01-07-2018
GD3: Vand- og klimadata	Afsluttet	
GD4: Geodata	Afsluttet	
GD5: Persondata	Afsluttet	
GD6: Virksomhedsdata	Afsluttet	
GD7: Datafordeler	31-12-2012	01-06-2019
GD8: It-arkitektur	Afsluttet	

SPECIFICERET STATUS PR. DELPROGRAM

DELPROGRAM	TID	SCOPE	RESSOURCER	SAMLET STATUS
GD1: Ejendomsdata	■	■	■	■
GD2: Adressedata	■	■	■	■
GD3: Vand- og klimadata	Afsluttet			
GD4: Geodata	Afsluttet			
GD5: Persondata	Afsluttet			
GD6: Virksomhedsdata	Afsluttet			
GD7: Datafordeler	■	■	■	■
GD8: It-arkitektur	Afsluttet			



## PROJEKTETS NAVN

**Generel udstillingsløsning (GUL)**

## SAMLET TRAFIKLYS



## MYNDIGHED

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Skatteministeriet

## PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

## BESKRIVELSE

Projektets mål er, at etablere en generel dataudstillingsløsning i SKAT til en række forskellige lovhjemlede formål, der på tværs af sagsbehandlingssituationer håndhæver logning, adgangsstyring, aftalestyring og datafiltrering.

## NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

## PROJEKTUDGIFTER

**26,9 mio. kr.**

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

## PROJEKTAFLUTNING

**1. juli 2020**

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

## NETTONUTIDSVÆRDI

**126,6 mio. kr.**

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER


Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, som begge forventes høstet fuldt ud.

PROJEKTETS NAVN

## Generel udstillingsløsning (GUL)


PROJEKTUDGIFTER

Mio. kr.

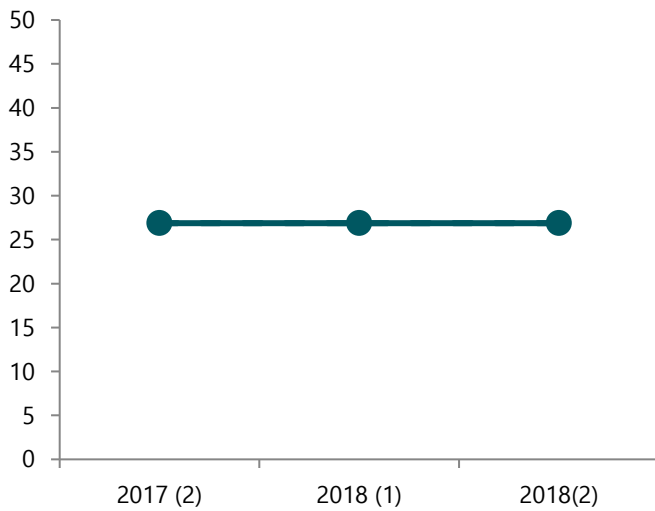

NETTONUTIDSVÆRDI

Mio. kr.

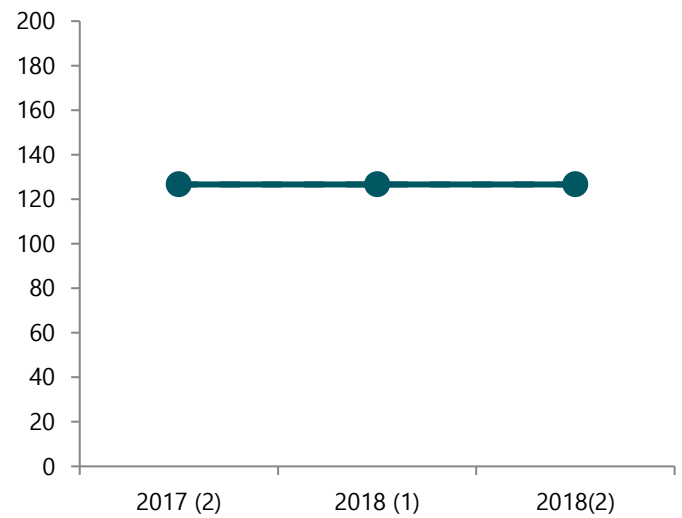

PROJEKT- AFSLUTNING	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	-	-	-	-	-	01-07-2020	01-07-2020	01-07-2020

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	-	-	-	-	-	■	■	■

## PROJEKTETS NAVN

## HR-projektet

## SAMLET TRAFIKLYS



## MYNDIGHED

Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet

## PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

## BESKRIVELSE

Projektet skal anskaffe et fællesstatsligt system til at understøtte HR-opgaverne inden for områderne personaleadministration, organisationsstyring og tidsregistrering. Projektet fokuserer på anskaffelse af et standardsystem samt konsulentassistance til at foretage væsentlige tilpasninger og udvidelser af pågældende standardsystem og implementere det i statens institutioner.

Projektet understøtter Moderniseringsstyrelsens strategiske pejlemærker om 1) at levere effektiv, sikker og målrettet rådgivning og systemunderstøttelse samt 2) at skabe gennemsigtighed og prioritering i styringen af den offentlige sektor. Dette sker ved at lukke det systemmæssige hul på HR-området samt sikre system- og datasammenhæng mellem HR- og øvrige fællesstatslige systemer. Desuden sikrer projektet, at mængden, kvaliteten og aktualiteten af HR-data til rapporterings- og analyseformål forbedres. Det forbedrede datagrundlag og datasammenhæng er en forudsætning for at understøtte forretningsmæssige behov vedrørende analyse, rapportering og benchmarks, og dermed effektiv styring både på lokalt, koncern og centralt niveau.

## NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

## PROJEKTUDGIFTER

93,5 mio. kr.

## AFGIVELSE IFT. BASELINE

Ingen

## PROJEKTAFLUTNING

30. november 2020

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

3 måneder

## NETTONUTIDSVÆRDI

11,6 mio. kr.

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen


IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER

Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, som begge forventes høstet fuldt ud.


PROJEKTETS  
NAVN

## HR-projektet

PROJEKTUDGIFTER

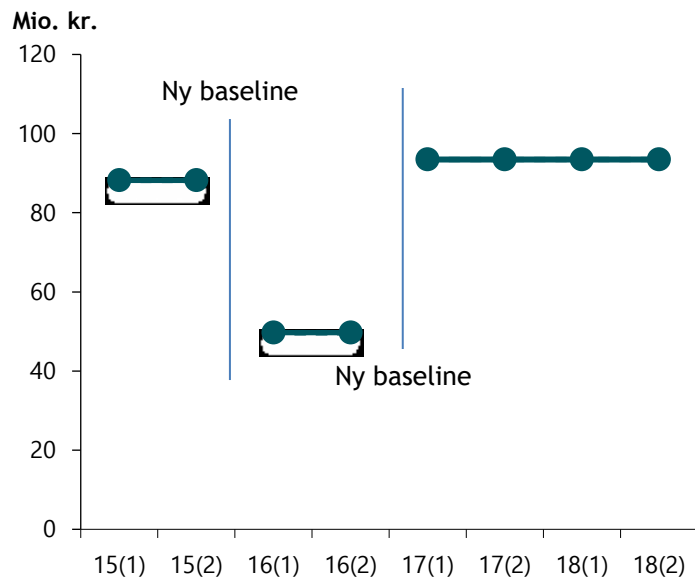

NETTONUTIDSVÆRDI

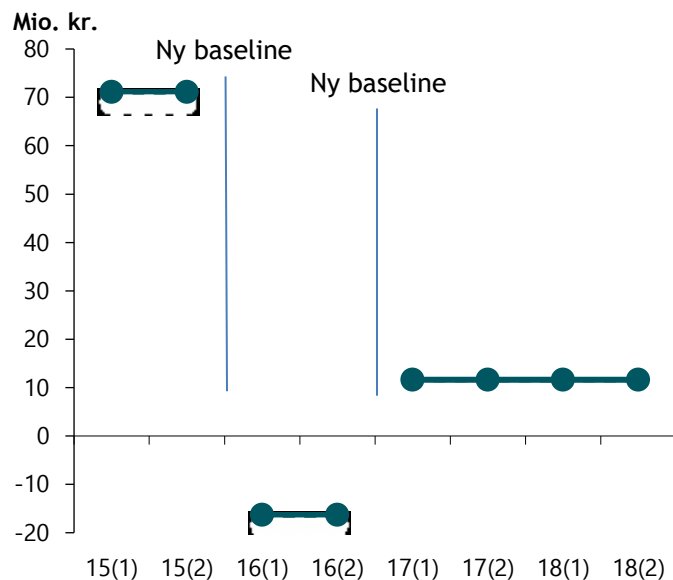

PROJEKT- AFSLUTNING	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	01-04-2019 (baseline)	01-04-2019	30-06-2019 (ny baseline)	31-08-2019	31-08-2020 (ny baseline)	31-08-2020	31-08-2020	30-11-2020

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	■ (baseline)	■	≡ (ny baseline)	■	≡ (ny baseline)	■	■	■

## PROJEKTETS NAVN

**IAM (Identity Asset Management)**

## SAMLET TRAFIKLYS



## MYNDIGHED

Rigspolitiet, Justitsministeriet

## PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

## BESKRIVELSE

Projektets formål er at øge kvaliteten i Rigspolitiets brugerstyring for at sikre compliance i den videre og stigende digitalisering af Rigspolitiet med dertilhørende effektiviseringsgevinster. Udover at anskaffe et nyt system til brugerhåndtering ønsker Rigspolitiet at løfte kvaliteten ved at standardisere jobprofiler (roller og rettigheder).

## NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

## PROJEKTUDGIFTER

**Fortroligt pga. udbud**

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

## PROJEKTAFSLUTNING

**Fortroligt pga. udbud**

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

## NETTONUTIDSVÆRDI

**Fortroligt pga. udbud**

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER

Projektet har tolv ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.

<b>PROJEKTETS NAVN</b>	<b>Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE)</b>
<b>SAMLET TRAFIKLYS</b>	Intet trafiklys
<b>MYNDIGHED</b>	Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Skatteministeriet
<b>PROJEKTETS FORMÅL</b>	ICE er i oktober 2014 etableret som en særskilt organisation i Skatteministeriets departement og har til formål at udvikle og implementere et nyt ejendomsvurderingssystem bl.a. med udgangspunkt i anbefalingerne fra Engbergudvalget.
<b>NUVÆRENDE FASE</b>	Gennemførelse
<b>SKATTEMINISTERIETS STATUS</b>	<p>Projektet følger nu den tidsplan, der blev præsenteret af skatteministeren for forligspartierne bag <i>Forlig om et nyt ejendomsvurderingssystem</i> den 31. oktober 2018. Projektets økonomi er på baggrund af den ændrede tidsplan under konsolidering, jf. nedenfor.</p> <p>Overordnet set er der fremdrift i det samlede program. Programmet har således gennemført tre testreleases fra december 2017 og frem til sommeren 2018 af det nye ejendomsvurderingssystem Ejendom og Grund (E&amp;G). De indledende releases er ikke leveret til egentlig produktion, men er blevet brugt til aftenstning af dele af systemet. Den første hovedrelease, Release 1.0, blev idriftsat i august 2018. Den indeholder funktionalitet til manuel fastsættelse af juridisk kategori for ejendomme, hvilket har sat Vurderingsstyrelsen i stand til at påbegynde første del af sagsbehandlingen i relation til de nye ejendomsvurderinger. Release 1.1, der er blevet testet i perioden oktober-december 2018, indeholder funktionalitet til at fastsætte juridisk kategori for restkategorier af ejendomme. Release blev idriftsat i uge 51 2018 og ibrugtaget i Vurderingsstyrelsen i primo januar 2019.</p> <p>I løbet af 2018 har der været behov for at revidere udsendelsesperioden for de nye ejendomsvurderinger. I foråret 2018 blev det besluttet, at de nye ejendomsvurderinger blev flyttet med 4 måneder fra 1. september 2018 til 1. januar 2019, således at vurderingerne ville blive udsendt i løbet af 2019 (ejerbolig) og 2020 (erhverv). I forlængelse af beslutningen blev forligspartierne bag <i>Forlig om et nyt ejendomsvurderingssystem</i> orienteret om, at tidsplanen for tilvejebringelse af et nyt vurderingssystem ville blive genbesøgt, når man havde erfaringer fra test af den første hovedrelease, samt kunne se om de initiativer, der blev igangsat for at øge ICEs samlede udviklingshastighed havde haft den ønskede effekt. Henover sommeren og gennem testen af Release 1.0, blev det klart, at udviklingshastigheden ikke var steget tilstrækkeligt, og at der udestod et arbejde med at skabe en ensartet datainfrastruktur. Derudover blev det konstateret, at ICE var nødt til at revurdere det hidtidige systemmæssige</p>

setup omkring sags- og dokumenthåndtering og arkivering og brevudsendelse. Disse var hovedårsagerne til, at man den 31. oktober 2018 præsenterede en ændret plan for udsendelse af de nye ejendomsvurderinger. Konkret forlænges udsendelsesperioden for ejendomsvurderingerne således, at de første nye vurderinger udsendes løbende fra 2. halvår 2020 (ejer) og fra 1. halvår 2021 (erhverv). Tidsplanen er fortsat ambitiøs, ligesom projektet fortsat er forbundet med en række betydelige risici og afhængigheder i forhold til især it-udviklingen.

Umiddelbart i forlængelse af lanceringen af den ændrede plan for udsendelse af de nye ejendomsvurderinger den 31. oktober 2018, blev konsolideringen af de samlede udgifter til udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem igangsat. Samtidig har ICE genoptaget arbejdet med udarbejdelse af en business case der omfatter ICE-programmet, og den forventes præsenteret primo 2019, således at den kan indgå i et kommende it-aktstykke for it-udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

## PROJEKTETS NAVN

## Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI)

## SAMLET TRAFIKLYS



## MYNDIGHED

Udvikling- og Forenklingsstyrelsen/Skatteforvaltningen, Skatteministeriet

## PROJEKTETS FORMÅL

Formålet for ICI er at tilvejebringe en midlertidig it-understøttelse til inddrivelsesområdet i SKAT, såvel som en langsigtet løsning til ibrugtagning i 2019. Hertil skal ICI understøtte nedlukningen af EFI/DMI i samarbejde med SKAT Inddrivelse, understøtte datavask af fordringer samt bidrage til at forenkle inddrivelseslovgivningen. ICI organiseres i en programstruktur og er under opbygning i Skatteministeriets departement på baggrund af erfaringerne fra Implementeringscenter for Ejendomsvurdering (ICE).

## NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

## PROJEKTUDGIFTER

AFGIVELSE IFT. BASELINE

**Fortroligt**

Ingen



## PROJEKTAFSLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**Fortroligt**

Ingen



## NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**Fortroligt**

Ingen

IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER

Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, som begge forventes høstet fuldt ud.



PROJEKTETS  
NAVN

## Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI)

PROJEKT- AFSLUTNING	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
			Fortroligt	Fortroligt	Fortroligt (ny baseline)	Fortroligt (ny baseline)	Fortroligt	Fortroligt (ny baseline)
HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS			■	■	☐ (ny baseline)	☐ (ny baseline)	■	☐ (ny baseline)

## PROJEKTETS NAVN

**Kapacitetsplanlægning**

## SAMLET TRAFIKLYS

Afsluttet i 1. halvår 2018

## MYNDIGHED

Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriet

## PROJEKTETS FORMÅL

Effektivisering

## BESKRIVELSE

Projektet skal levere beregninger og oversigtsbilleder, som gør organisationen i stand til at træffe de rigtige valg i forbindelse med planlægning, allokering, gennemførelse og opfølgning på opgaver i vedligeholdelsesstrukturen under Værnsfælles forsvarskommando (VFK).

## NUVÆRENDE FASE

Realisering

## PROJEKTUDGIFTER

**21,7 mio. kr.**

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

↑

3,4 mio. kr.

## PROJEKTAFLUTNING

**11. maj 2018**

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

6 måneder

## NETTONUTIDSVÆRDI

**4,9 mio. kr.**

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen

IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER



Projektet har ingen ikke-økonomiske gevinster.

PROJEKTETS  
NAVN

## Kapacitetsplanlægning

PROJEKTUDGIFTER

NETTONUTIDSVÆRDI

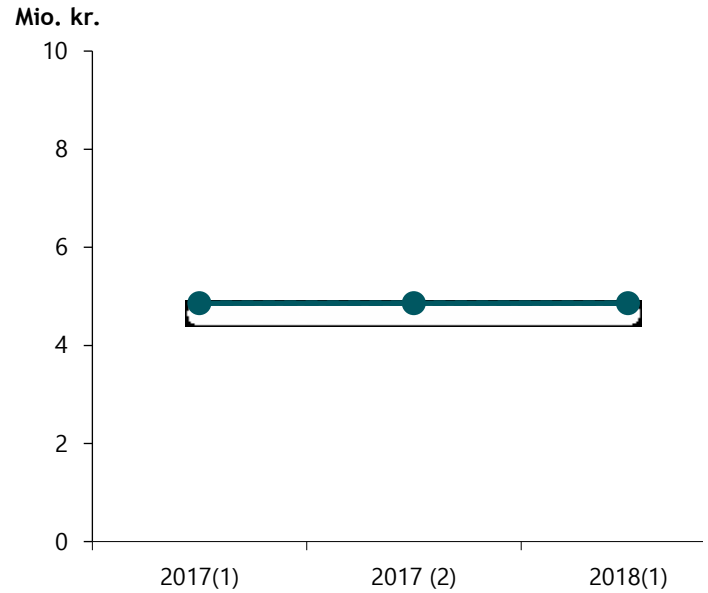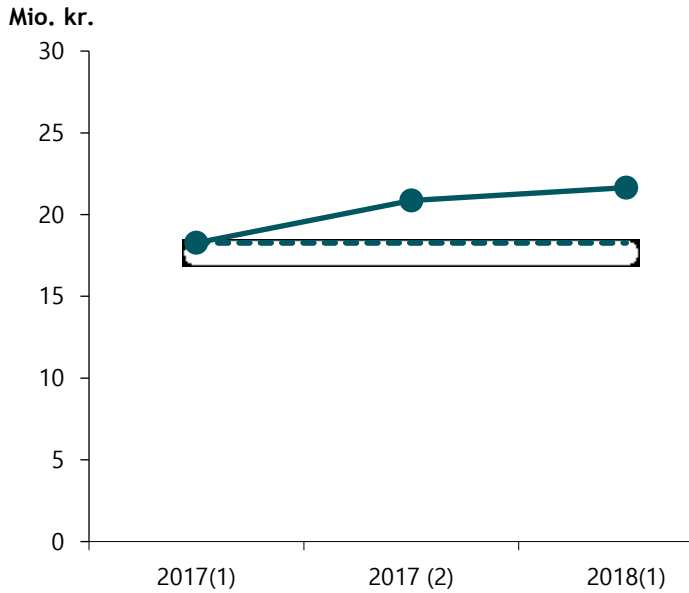

PROJEKT- AFSLUTNING	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	-	-	-	-	01-11-2017	26-03-2018	Afsluttet (11-05-2018)	-

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	-	-	-	-	■	■	Afsluttet	-

## PROJEKTETS NAVN

**Krav og udbetaling**

## SAMLET TRAFIKLYS



## MYNDIGHED

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, Uddannelses- og Forskningsministeriet

## PROJEKTETS FORMÅL

Lovgivning

## BESKRIVELSE

Projektets formål er at sikre overholdelse af juridiske retningslinjer for modregning i SU-stipendier, overholdelse af SKAT's myndighedskrav samt en øget automatisering af rejsning og frafald af krav om tilbagebetaling af SU. Dette sker gennem en teknisk omlægning og tilpasning af SU-systemkompleksets programkomponenter vedrørende:

1. Udbetaling af uddannelsesstøtte.
2. Rejsning og frafald af krav om tilbagebetaling af for meget ubetalt uddannelsesstøtte.

## NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

## PROJEKTUDGIFTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE



**31,2 mio. kr.**

-5,1 mio. kr.



## PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**1. juli 2019**

Ingen



## NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE



**23,4 mio. kr.**

5,1 mio. kr.

IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER


Projektet har ni ikke-økonomiske gevinster.

PROJEKTETS-  
NAVN

## Krav og udbetaling


PROJEKTUDGIFTER

Mio. kr.

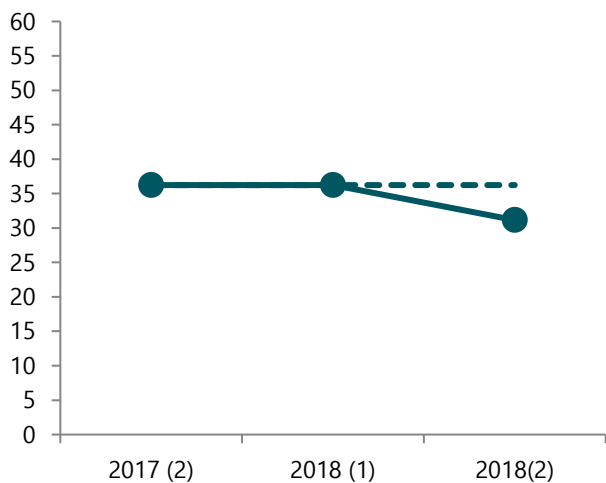

NETTONUTIDSVÆRDI

Mio. kr.

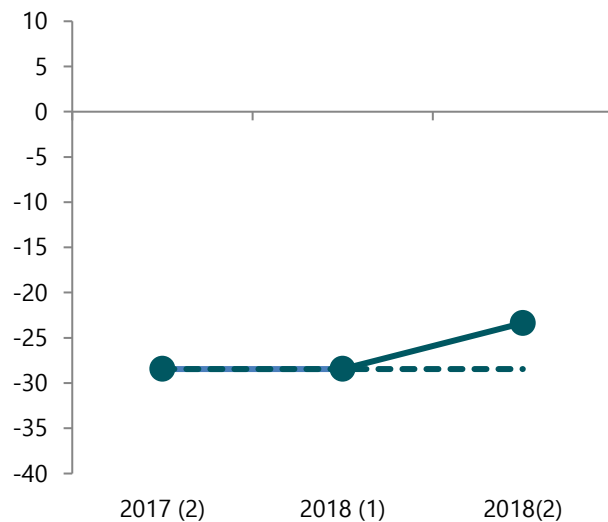

PROJEKT- AFSLUTNING	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
						01-07-2019	01-07-2019	01-07-2019

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
						■	■	■

## PROJEKTETS NAVN

**LEOPARD**

## SAMLET TRAFIKLYS



## MYNDIGHED

Lægemiddelstyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet

## PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

## BESKRIVELSE

Projektets formål er at modernisere det danske lægemiddelregister på en ny standardplatform, så det bliver compliant med krav i den europæiske lægemiddelregulering med ikrafttræden i 2019 og samtidig mere robust og agilt. Moderniseringen består i en skarpt scoped og tilsvarende hurtigt leveret LEOPARD.

## NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

## PROJEKTUDGIFTER

**50,0 mio. kr.**


## AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

## PROJEKTAFLUTNING

**1. april 2020**

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

6 måneder 

## NETTONUTIDSVÆRDI

**-34.4 mio. kr.**

## AFVIGELSE IFT. BASELINE



Ingen IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER

Projektet har fem ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.

PROJEKTETS NAVN **LEOPARD**

PROJEKTUDGIFTER

NETTONUTIDSVÆRDI

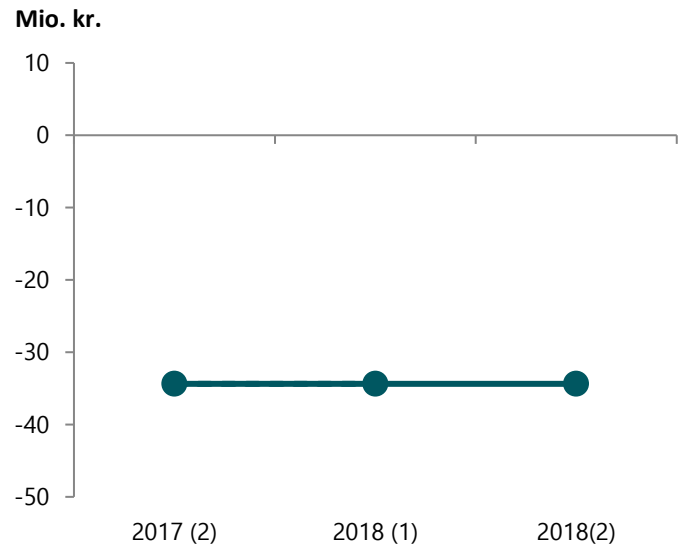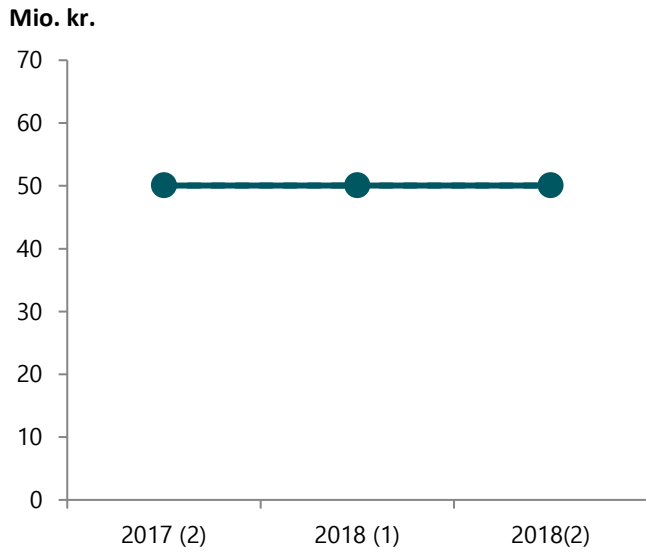

	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
<b>PROJEKT- AFSLUTNING</b>						01-01-2019	01-01-2019	01-04-2020
<b>HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS</b>						■	■	■

## PROJEKTETS NAVN

**LPR3 (Landspatientregistret 3)**

## SAMLET TRAFIKLYS



## MYNDIGHED

Sundhedsdatastyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet

## PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

## BESKRIVELSE

Helt centralt i Sundhedsdataprogrammets arbejde er udvikling af et nyt Landspatientregister, LPR3, da det eksisterende Landspatientregister (LPR2) ikke kan imødekomme de krav, der er til en fremtidssikret løsning. Ved at gennemføre LPR3-projektet bliver LPR omlagt, så registeret bliver i stand til at levere information om hele patientforløb. LPR3-projektet skal således bidrage til at realisere programmets vision ved at anskaffe og implementere den it-løsning, der skal danne grundlag for beskrivelsen af det samlede patientforløb og sikre større synlighed om resultater på de enkelte sygehusafdelinger og på tværs af sygehuse, regioner og kommuner.

## NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

## PROJEKTUDGIFTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**45,6 mio. kr.**

6,2 mio. kr.



## PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**1. marts 2019**

3 måneder



## NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**-39,1 mio. kr.**

-5,0 mio. kr.

IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER

Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, som begge forventes høstet fuldt ud.


\*De samlede projektudgifter er ekskl. risikopuljen, som holdes på programniveau. Fordyrelsen skyldes indtrufne risici, hvilket dækkes af risikopuljen.




PROJEKTETS  
NAVN

## Landspatientregistret 3 (LPR3)

PROJEKTUDGIFTER

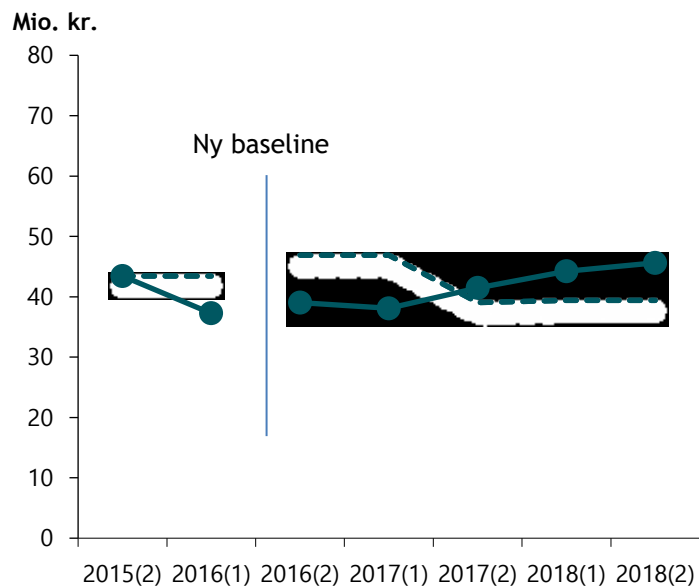

NETTONUTIDSVÆRDI

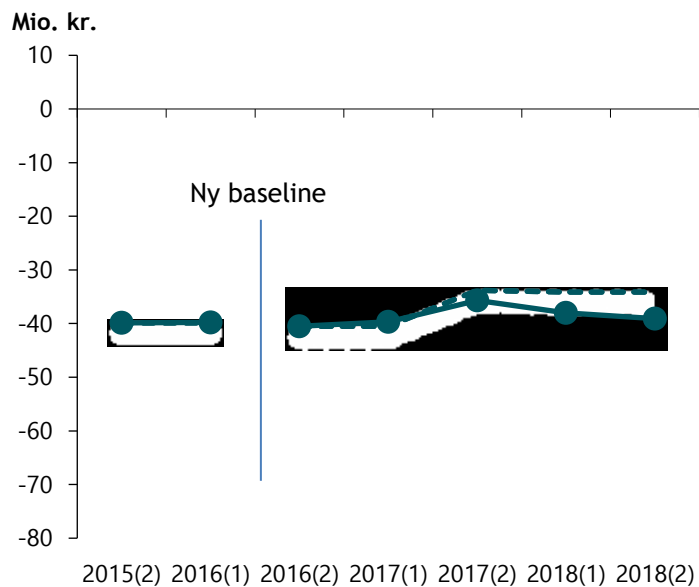

\*Baseline for projektudgifterne er ændret for 2017 (2), eftersom risikopoljen er fraregnet.

\*Baseline er ændret for nettonutidsværdien 2017 (2), eftersom risikopoljen er fraregnet.

	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
<b>PROJEKT- AFSLUTNING</b>	-	04-07-2017	01-12-2018	01-12-2018 (ny baseline)	01-12-2018	01-12-2018	01-03-2019	01-03-2019
<b>HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS</b>	-	■	■	≡ (ny baseline)	■	■	■	■

PROJEKTETS NAVN

MitID

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Projektet har til formål at gennemføre fornyet udbud af NemID med henblik på fortsat at kunne stille en sikker og brugervenlig eID og digital signatløsning til rådighed for borgere og erhvervsbrugere i Danmark.

NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

PROJEKTUDGIFTER

AFGIVELSE IFT. BASELINE

**Fortroligt pga. udbud**

Ingen



PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**Fortroligt pga. udbud**

2,9 måneder



NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**Fortroligt pga. udbud**

Ingen



IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER

Projektet har fire ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.

## PROJEKTETS NAVN

**Modernisering af Datamodtagelse (SEI-2)**

## SAMLET TRAFIKLYS



## MYNDIGHED

Sundhedsdatastyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet

## PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

## BESKRIVELSE

Projektet, der er en del af Sundhedsdataprogrammet, skal modernisere den eksisterende indberetning af sundhedsdata SEI. SEI er et generelt indberetningssystem, der gør det muligt for sundhedsfagligt personale at indberette data elektronisk til Sundhedsdatastyrelsen. Der indføres bl.a. en webbaseret brugergrænseflade, der sker en ensretning af brugerstyringen, og det bliver muligt for Sundhedsdatastyrelsen selv at opsætte nye skemaer mv.

## NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

## PROJEKTUDGIFTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**23,4 mio. kr.**

0,8 mio. kr.



## PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**1. marts 2019**

2 måneder



## NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**-13,3 mio. kr.**

Ingen

IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER



Projektet har fire ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.

PROJEKTETS  
NAVN

## Modernisering af Datamodtagelse (SEI-2)

PROJEKTUDGIFTER

NETTONUTIDSVÆRDI

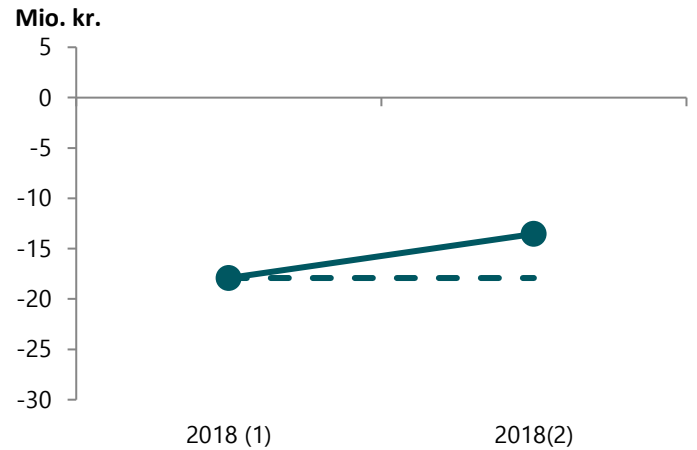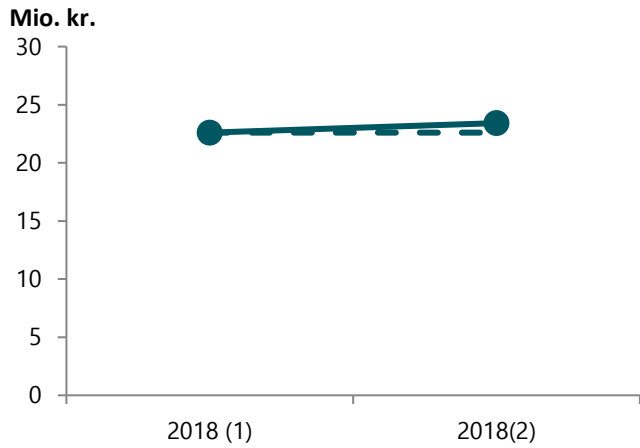

	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
<b>PROJEKT- AFSLUTNING</b>	-	-	-	-	-	-	01-01-2019 (baseline)	01-03-2019
<b>HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS</b>	-	-	-	-	-	-	■	■

## PROJEKTETS NAVN

**MSD**

## SAMLET TRAFIKLYS



## MYNDIGHED

Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriet

## PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

## BESKRIVELSE

Projektet implementerer SAP-modulet Master Data Governance (SAP MDG) til at systemunderstøtte fremtidige forretningsprocesser i forhold til introduktion af og ændringer til materialemasterdata i DeMars/SAP ECC. SAP MDG skal erstatte det nuværende system til håndtering af materielstamdata, MATDATA.

## NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

## PROJEKTUDGIFTER

**53,0 mio. kr.**

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

## PROJEKTAFLUTNING

**11. juli 2019**

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

## NETTONUTIDSVÆRDI

**-34,7 mio. kr.**


## AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER


Projektet har fire ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.

PROJEKTETS NAVN **MSD**

PROJEKTUDGIFTER

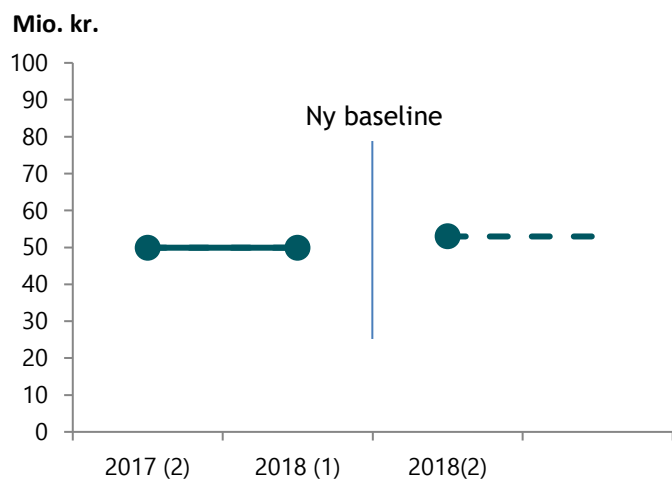

NETTONUTIDSVÆRDI

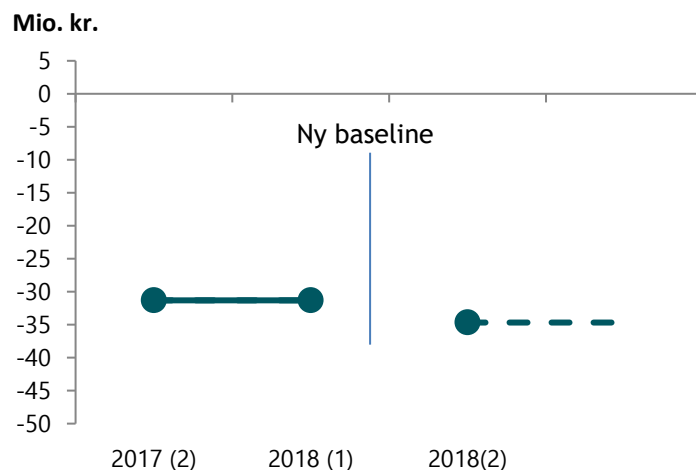

PROJEKT- AFSLUTNING	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	-	-	-	-	-	31-12-2018	30-04-2019	11-07-2019 (ny baseline)

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	-	-	-	-	-	■	■	■ (ny baseline)

## PROJEKTETS NAVN

**Mustang (tidl. It-understøttelse af afregning og support af VE-ordninger)**

## SAMLET TRAFIKLYS



## MYNDIGHED

Energistyrelsen, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

## PROJEKTETS FORMÅL

Lovgivning

## BESKRIVELSE

Energistyrelsen varetager en række støtteordninger for vedvarende energi, og har til dette formål en høj grad af it-understøttelse fordelt på forskellige systemtyper, f.eks. selvbetjeningsløsninger, sagsbehandlingssystemer og afregningssystemer. Helt centralt i denne it-understøttelse er afregningssystemet Panda, som leverandøren tager ud af produktion i november 2019. Derfor skal der anskaffes en tilsvarende it-løsning.

## NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

## PROJEKTUDGIFTER

**Fortroligt pga. udbud**

## AFGIVELSE IFT. BASELINE

Fortroligt 

## PROJEKTAFLUTNING

**Fortroligt pga. udbud**

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

12 måneder 

## NETTONUTIDSVÆRDI

**Fortroligt pga. udbud**

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt **IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER**

Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.

## PROJEKTETS NAVN

**Nationalt eID-Gateway**

## SAMLET TRAFIKLYS

Afsluttet

## MYNDIGHED

Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet

## PROJEKTETS FORMÅL

Lovgivning

## BESKRIVELSE

Formålet med projektet er, at opfylde Danmarks forpligtelser i eIDAS-forordningen (EU-lovgivning) ved at stille en snitflade og et integrationstestmiljø til rådighed i form af en eID gateway, som danske tjenesteudbydere kan integrere til. Projektet sikrer således, at den danske digitale infrastruktur teknisk og organisatorisk opfylder eIDAS-forordningen, når den træder i kraft d. 18. september 2018.

## NUVÆRENDE FASE

Realisering

## PROJEKTUDGIFTER

**12,3 mio. kr.**

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

↓  
-0,3 mio. kr.

## PROJEKTAFLUTNING

**11. januar 2019**

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

3,4 måneder

## NETTONUTIDSVÆRDI

**-21,8 mio. kr.**

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

↓  
-10,1 mio. kr.IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER

Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.




PROJEKTETS  
NAVN

## Nationalt eID-Gateway


PROJEKTUDGIFTER

NETTONUTIDSVÆRDI

Mio. kr.

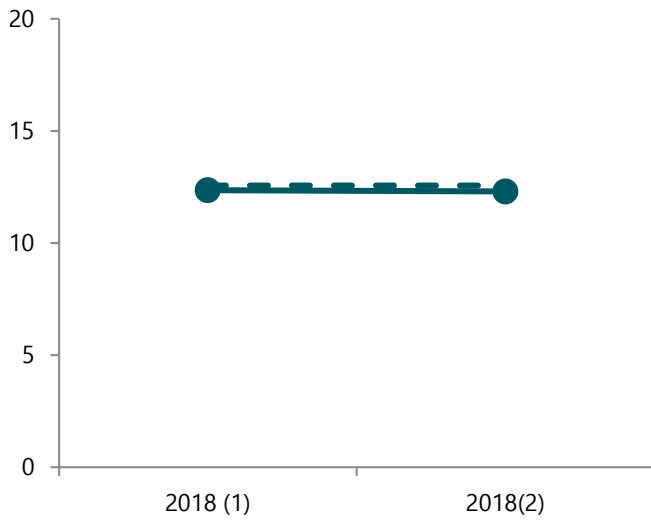

Mio. kr.

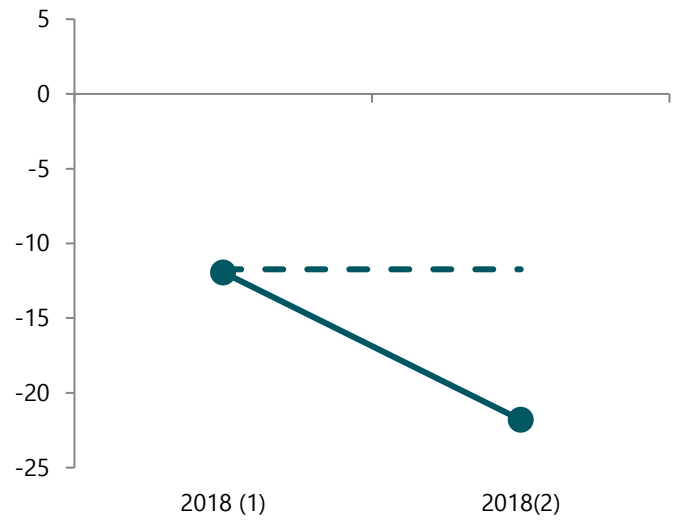

	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
<b>PROJEKT- AFSLUTNING</b>	-	-	-	-	-	-	30-09-2019 (baseline)	11-01-2019 (Afsluttet)
<b>HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS</b>	-	-	-	-	-	-	■	Afsluttet

## PROJEKTETS NAVN

## NemLog-in3

## SAMLET TRAFIKLYS



## MYNDIGHED

Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet

## PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

## BESKRIVELSE

Kontrakten med leverandøren på den eksisterende NemLog-in-løsning udløber i januar 2019. Derfor skal NemLog-in igen udbydes. Det forventes, at den eksisterende NemLog-in-løsning skal videreføres, men med mulighed for videreudvikling af funktionalitet. Dette skal ske i et agilt setup, hvor nye elementer udvikles, efterhånden som behovet opstår. Projektet skal således sikre en forbedret version af den sikre, nationale platform for login og brugerstyring.

Der er udestående, så indstilling til trafiklys kan ikke laves dags dato.

## NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

## PROJEKTUDGIFTER

**Fortroligt pga. udbud**

## AFGIVELSE IFT. BASELINE

Fortroligt 

## PROJEKTAFLUTNING

**Fortroligt pga. udbud**

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

## NETTONUTIDSVÆRDI

**Fortroligt pga. udbud**

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

Fortroligt IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER

Projektet har seks ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.

## PROJEKTETS NAVN

**NemVirksomhed**

## SAMLET TRAFIKLYS

Afsluttet

## MYNDIGHED

SKAT, Skatteministeriet

## PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

## BESKRIVELSE

Som en del af aftale om Vækstpakke 2014 er regeringen og de øvrige aftaleparter blevet enige om at lancere initiativet NemVirksomhed, som skal reducere enkeltmandsvirksomheders tidsforbrug på bogføring samt afregning af moms og skat gennem etablering af følgende elementer: En bogføringsguide & standardkontoplan i regnskabssystemet til afhjælpning af fejl samt indberetning og afregning af moms og skat ved etablering af interfaces imellem regnskabssystemerne og SKAT

Målgruppen for NemVirksomhed er enkeltmandsvirksomheder uden ansatte, som ikke har andre pligter end momspligten og som eventuelt handler på tværs af lande inden for EU. Projektet skal således hjælpe til at gøre det lettere at starte og drive selvstændig virksomhed i Danmark. Man skal kunne starte virksomhed og vil få hjælp til de administrative krav, der stilles fra bl.a. SKAT's side, til bl.a. at føre regnskab, at kende moms- og skatteregler, og det er visionen, at virksomhederne på sigt kan foretage "fuld betjening" direkte fra regnskabssystemet uden at skulle anvende SKAT's mange selvbetjeningsløsninger.

## NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

## PROJEKTUDGIFTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**34,6 mio. kr.**

-6,1 mio. kr.

## PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**21. marts 2018**

7 måneder

## NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**-61,3 mio. kr.**

13,4 mio. kr.

IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER



Projektet har én ikke-økonomisk gevinst, der forventes høstet fuldt ud.

PROJEKTETS  
NAVN

## NemVirksomhed

PROJEKTUDGIFTER

NETTONUTIDSVÆRDI

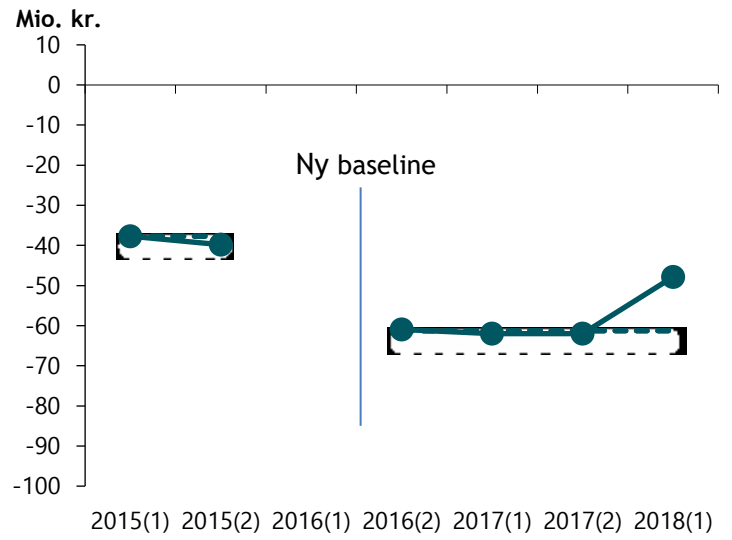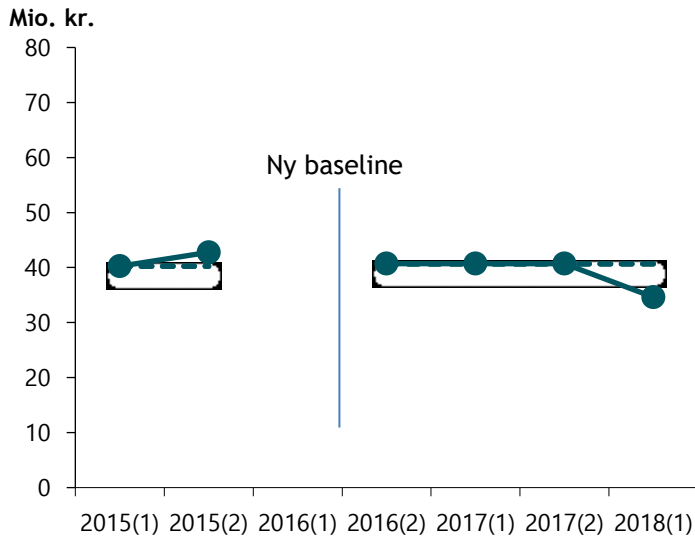

	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
<b>PROJEKT- AFSLUTNING</b>	28-02-2017 (baseline)	28-02-2017	28-02-2017 (Under replan.)	30-01-2017	05-02-2018	01-03-2018	21-03-2018 (Afsluttet)	-
<b>HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS</b>	■ (baseline)	■	■	■	■	■	Afsluttet	-


<b>PROJEKTETS NAVN</b>	<b>Netprøver.dk (tidl. XIT-GYM)</b>
<b>SAMLET TRAFIKLYS</b>	Afsluttet
<b>MYNDIGHED</b>	Styrelsen for It og Læring, Undervisningsministeriet
<b>PROJEKTETS FORMÅL</b>	Effektivisering
<b>BESKRIVELSE</b>	<p>På det gymnasiale område har Undervisningsministeriet de seneste år gennemført analyser af forskellige modeller for digitalisering af prøveprocesser, hvor udfaldet er blevet en anbefaling af en central løsning. Parallelt er der en fortsat løbende dialog med sektorens lederforeninger, som tilkendegiver, at sektoren er klar.</p> <p>Det primære formål med indførelse af XIT på de gymnasiale uddannelser er effektivisering. Effektivisering opnås ved at tilvejebringe en it-løsning, der digitaliserer prøveprocesserne ved de skriftlige prøver på de gymnasiale uddannelser (stedprøver, SRP, SRO), således at de papirrelaterede manuelle arbejdsgange afskaffes..</p>
<b>NUVÆRENDE FASE</b>	Gennemførelse
<b>PROJEKTUDGIFTER</b>	<b>38 mio. kr.</b>
AFGIVELSE IFT. BASELINE	↓ -6,3 mio. kr.
<b>PROJEKTAFSLUTNING</b>	<b>1. juni 2018</b>
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen
<b>NETTONUTIDSVÆRDI</b>	<b>-5,6 mio. kr.</b>
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↓ -23,8 mio. kr.
<b>IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER</b>	Projektet har én ikke-økonomisk gevinst, som forventes høstet fuldt ud

PROJEKTETS  
NAVN

## Netprøver.dk (tidl. XIT-GYM)


PROJEKTUDGIFTER

Mio. kr.

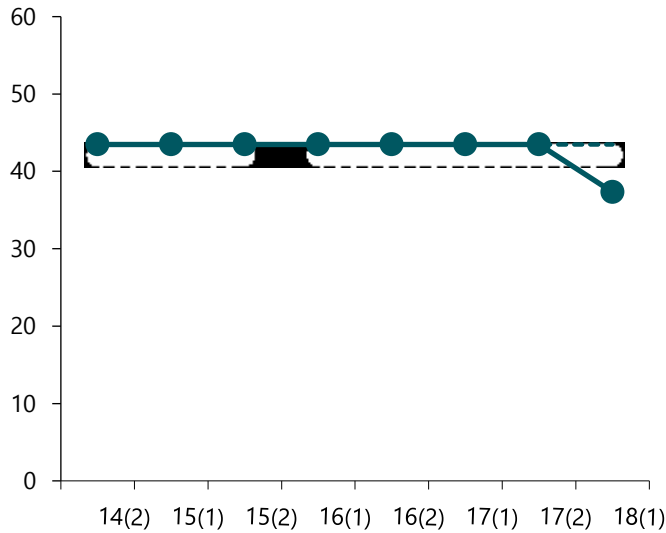

NETTONUTIDSVÆRDI

Mio. kr.

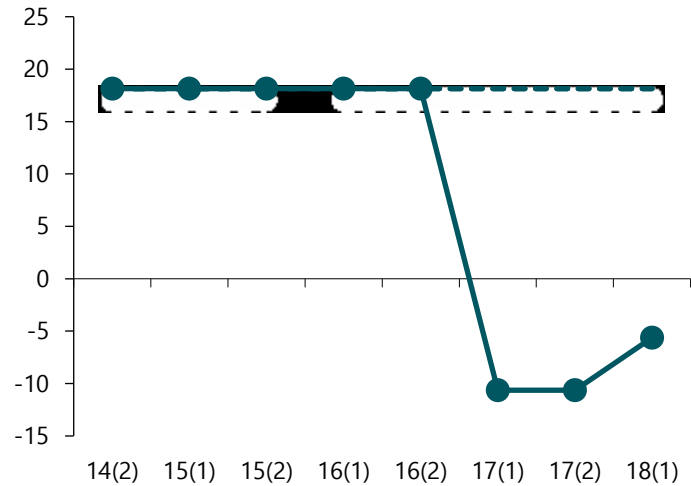

PROJEKT- AFSLUTNING	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	01-06-2018 (baseline)	01-06-2018	01-06-2018	01-06-2018	01-06-2018	01-06-2018	01-06-2018 (Afsluttet)	-

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	■	■	■	■	■	■	■ (Afsluttet)	-

## PROJEKTETS NAVN

## Ny ESDH-løsning

## SAMLET TRAFIKLYS



## MYNDIGHED

Udlændinge- og Integrationsministeriet

## PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

## BESKRIVELSE

Projektets formål er modernisering af den eksisterende systemunderstøttelse på Udlændingesagskæden ved anskaffelse og implementering af et nyt ESDH-system, som skal sikre mere stabil drift og performanceforbedringer samt understøttelse af sagsbehandling. Udsiftningen af det nuværende system (EstherH) er en del af UIM's Digitaliseringsstrategi inden for indsatsområde 1: Stabilisering og optimering af it-driften og har højeste prioritet i porteføljen hos UIM. Udsiftning af EstherH muliggør samtidigt at data i det nye system designes i henhold til et nyt fælles data- og begrebsgrundlag på Udlændingeområdet. Dette vil blandt andet betyde, at UIM fremadrettet vil kunne udvikle særlig systemunderstøttelse til et bestemt forretningsområde.

## NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

## PROJEKTUDGIFTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE



45,2 mio. kr.

3,1 mio. kr.



## PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

25. oktober 2019

2,8 måneder



## NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE



-5,7 mio. kr.

-3,4 mio. kr.

IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER


Projektet har to ikke-økonomisk gevinst, der forventes høstet fuldt ud.

PROJEKTETS  
NAVN

## Ny ESDH-løsning


PROJEKTUDGIFTER

Mio. kr.

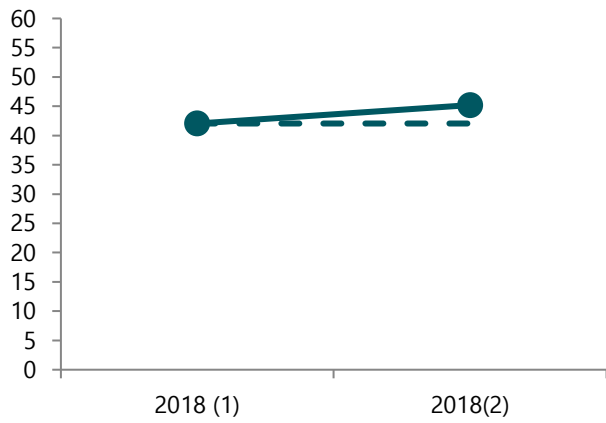

NETTONUTIDSVÆRDI

Mio. kr.

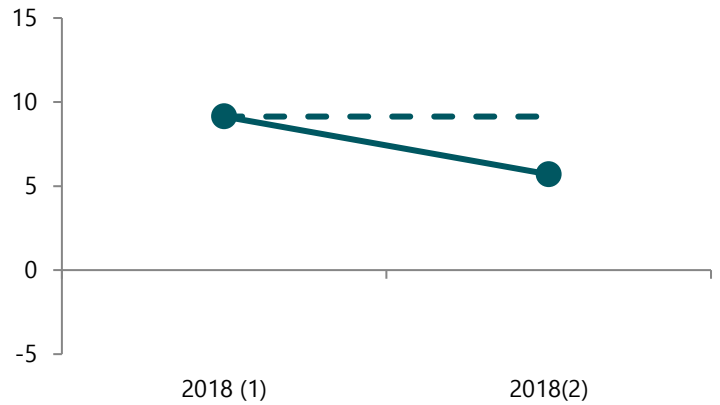

PROJEKT- AFSLUTNING	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	-	-	-	-	-	-	01-10-2019	25-10-2019

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	-	-	-	-	-	-	■	■



PROJEKTETS NAVN

**Nyt Politi.dk**

SAMLET TRAFIKLYS



MYNDIGHED

Rigspolitiet, Justitsministeriet

PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

BESKRIVELSE

Projektets formål er anskaffelse af en ny tidssvarende hjemmeside til politiet, herunder en løsning til håndtering af politiets krisekommunikation ved større hændelser, inkorporering af nuværende separate hjemmesider i politiet samt anskaffelse af ekstern vedligehold og drift af den samlede løsning.

NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

PROJEKTUDGIFTER

**17,3 mio. kr.**

AFGIVELSE IFT. BASELINE



-2,2 mio. kr.



PROJEKTAFLUTNING

**10. maj 2019**

AFVIGELSE IFT. BASELINE

2,3 måneder



NETTONUTIDSVÆRDI

**-13,9 mio. kr.**

AFVIGELSE IFT. BASELINE



2,3 mio. kr.



IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER

Projektet har fem ikke-økonomisk gevinst, som alle forventes høstet fuldt ud.


PROJEKTETS  
NAVN

Nyt Politi.dk


PROJEKTUDGIFTER

NETTONUTIDSVERDI

Mio. kr.

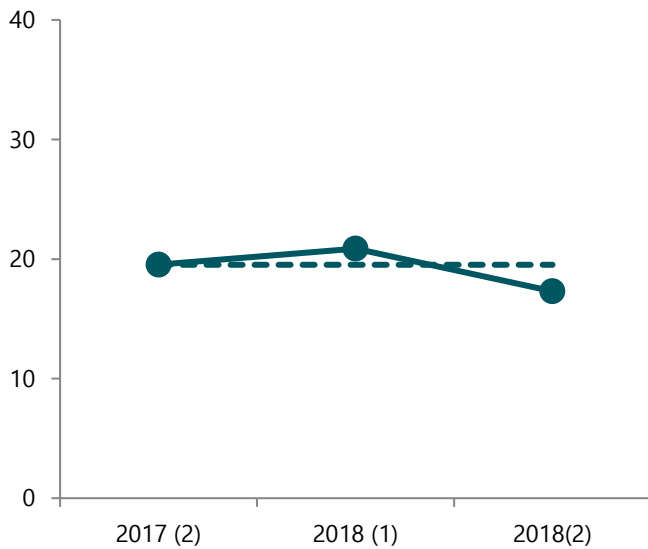

Mio. kr.

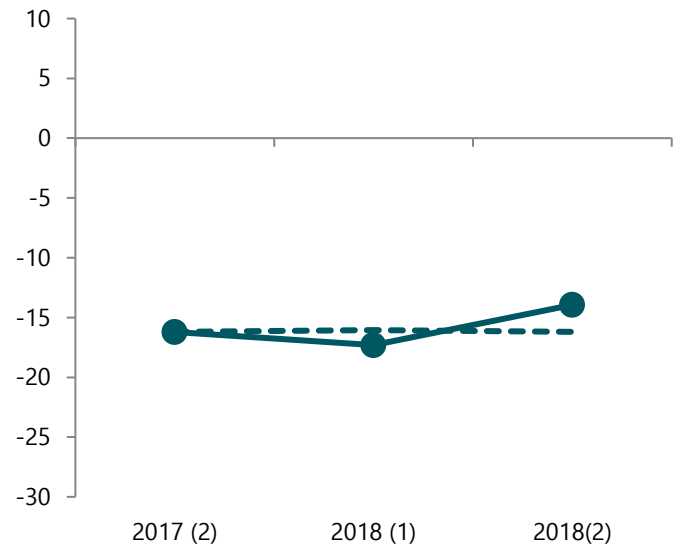

PROJEKT- AFSLUTNING	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	-	-	-	-	-	28-02-2019	28-02-2019	10-05-2019

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	-	-	-	-	-	■	■	■

## PROJEKTETS NAVN

## Nyt Tjenestetidssystem

## SAMLET TRAFIKLYS



## MYNDIGHED

Direktoratet for Kriminalforsorgen, Justitsministeriet

## PROJEKTETS FORMÅL

Effektivisering

## BESKRIVELSE

Som en del af reorganiseringen i Kriminalforsorgen etableres en områdestruktur, der indebærer, at planlægning ikke fremadrettet vil finde sted institution for institution, men for et område samlet. Derfor etableres et tjenestetidssystem, der muliggør planlægning på områdeniveau.

Som led i etableringen af et nyt tjenestetidssystem ses yderligere mulighed for effektivisering ved at nedbringe udgifterne til indkaldelse af vagtpersonale ved bl.a. sygdom. Nedbringelsen sker, fordi der automatisk dannes vagtplaner, der på baggrund af indbyggede logikker i tjenestetidssystemet, optimerer mulighederne for, at der disponeres personale, der kan indkaldes og dække vagten. Herved sparer Kriminalforsorgen udgifter til ekstrabetaling af personale. Endelig har projektet til formål at bidrage til et kvalitetsløft fsva. bl.a. arbejdsmiljø og bedre it-infrastruktur. Et nyt og moderne tjenestetidssystem kan bidrage til et bedre arbejdsmiljø, da den automatiske udarbejdelse af vagtplaner sker i overensstemmelse med fastlagte regler.

## NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

## PROJEKTUDGIFTER

26 mio. kr.

## AFGIVELSE IFT. BASELINE

Ingen



## PROJEKTAFLUTNING

1. marts 2019

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

1 måned



## NETTONUTIDSVÆRDI

-11,9 mio. kr.

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen


IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER

Projektet har tre ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.


PROJEKTETS  
NAVN

## Nyt Tjenestetidssystem

PROJEKTUDGIFTER

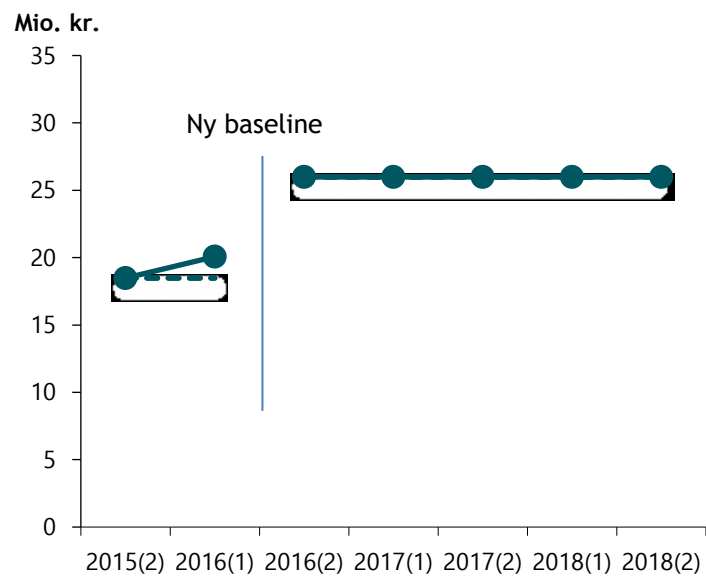

NETTONUTIDSVÆRDI

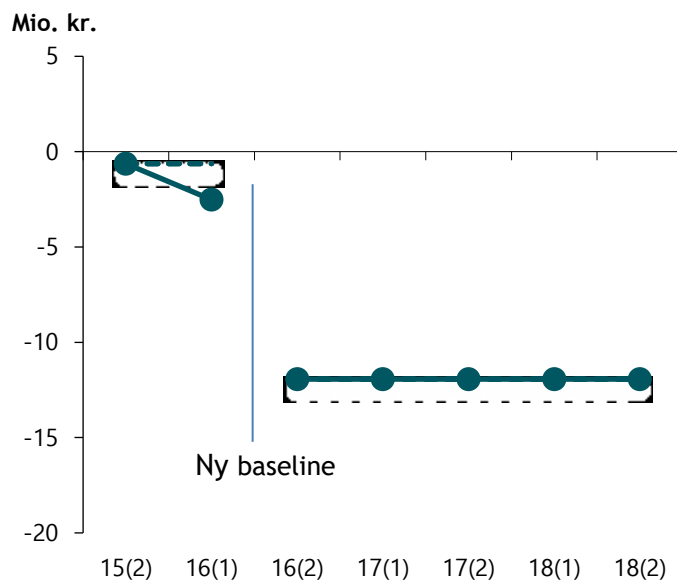

PROJEKT- AFSLUTNING	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	-	01-09-2017	18-12-2017	01-02-2019 (ny baseline)	01-02-2019	01-02-2019	01-02-2019	01-02-2019

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	-	■	■	■ (ny baseline)	■	■	■	■

## PROJEKTETS NAVN

## Næste generation Digital Post

## SAMLET TRAFIKLYS



## MYNDIGHED

Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet

## PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

## BESKRIVELSE

Næste generation Digital Post er løsningen, der skal erstatte den nuværende Digital Post løsning. Projektet der skal etablere den fremtidige løsning, har følgende formål: Øge effektiviteten, forbedre oplevelsen af Digital Post-løsningen samt levere Danmarks enkle kommunikationsløsning, der er fremtidssikret, og kan bruges af alle til at distribuere og modtage vigtig information, herunder sikker og uafviselig post jf. lov om Digital Post fra offentlige afsendere. Projektets vision er formuleret som følgende: Danmarks enkle kommunikationsløsning til vigtig information.

## NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

## PROJEKTUDGIFTER

AFGIVELSE IFT. BASELINE

**Fortroligt pga. udbud**

Fortroligt



## PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**Fortroligt pga. udbud**

Fortroligt



## NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**Fortroligt pga. udbud**

Fortroligt

IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER

Projektet har tre ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.

## PROJEKTETS NAVN

**OMS-projektet**

## SAMLET TRAFIKLYS



## MYNDIGHED

Kriminalforsorgen, Justitsministeriet

## PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

## BESKRIVELSE

Kriminalforsorgen ønsker at udskifte det eksisterende klientsystem (KS) med en standardløsning kaldet OMS (Offender Management System). Forventninger er, at et OMS vil kunne dække langt de fleste af Kriminalforsorgens behov for it-understøttelse af klientrettede opgaver - og tilbyde mange nye muligheder, som vil lette og forbedre klienthåndteringen.

## NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

## PROJEKTUDGIFTER

AFGIVELSE IFT. BASELINE

**Fortroligt pga. udbud**

Under nedlukning



## PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**Fortroligt pga. udbud**

Under nedlukning



## NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**Fortroligt pga. udbud**

Under nedlukning

IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER

Projektet har fem ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.

## PROJEKTETS NAVN

**POL-DAM**

## SAMLET TRAFIKLYS



## MYNDIGHED

Rigspolitiet, Justitsministeriet

## PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

## BESKRIVELSE

Formålet med projektet er at anskaffe og implementere en digital asset management-løsning (DAM). DAM-løsningen er et sammenhængende system til indlæsning, opbevaring, søgning, gennemsyn, distribution og sletning af video-, billed- og audiofiler – en løsning der således vil standardisere og effektivisere politiets arbejde med fornævnte og vil fungere i et operativt spekter, der rækker fra den daglige sagsunderstøttelse til ”manhunt”-operationer og ved større uvarslede hændelser som for eksempel terrorhændelser.

## NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

## PROJEKTUDGIFTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**Fortroligt pga. udbud**Ingen 

## PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**Fortroligt pga. udbud**2 måneder 

## NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**Fortroligt pga. udbud**Ingen IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER

Projektet har seks ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.

## PROJEKTETS NAVN

**POL-DISP**

## SAMLET TRAFIKLYS



## MYNDIGHED

Rigspolitiet, Justitsministeriet

## PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

## BESKRIVELSE

Projektet har til formål at specificere, anskaffe og implementere en national operativ disponeringsplatform til dansk politi, der samler, bearbejder og præsenterer information i et overskueligt situationsoverblik hos landets politikredse samt hos de regionale og nationale situations- og operationscentre. Platformen skal kunne anvendes i både den daglige disponering og ved større hændelser. Moderniseringen af vagtcentralernes og operationscentrenes it-understøttelse vil derfor udgøre en betydelig kvalitativ forbedring af politiets operative parathed.

## NUVÆRENDE FASE

Anskaffelse

## PROJEKTUDGIFTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**Fortroligt pga. udbud**Ingen 

## PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**Fortroligt pga. udbud**Ingen 

## NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**Fortroligt pga. udbud**Ingen IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER

Projektet har seks ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.




<b>PROJEKTETS NAVN</b>	<b>POL-INTEL</b>
<b>SAMLET TRAFIKLYS</b>	Afsluttet
<b>MYNDIGHED</b>	Rigspolitiet, Justitsministeriet
<b>PROJEKTETS FORMÅL</b>	Kvalitetsløft
<b>BESKRIVELSE</b>	<p>Dansk politi har igangsat et projekt til anskaffelse og implementering af en analyseplatform. En analyseplatform er et sammenhængende system til bearbejdning og analyse af de store datamængder, som generes både internt og eksternt; og som giver dansk politi helt nye muligheder for at arbejde proaktivt, effektivt og integreret med kriminalitetsforebyggelse, efterforskning og monitorering, også kendt som intelligence-led policing.</p> <p>Analyseplatformen baseres på et velafprøvet standardsystem (COTS). Derfor findes der minimum fem realistiske leverandører af en analyseplatform, der vil kunne adressere det ”åbne” politi (og PETs) behov. POL-INTEL vil derfor blive baseret på et velafprøvet standardsystem (COTS), som skal konfigureres, så det passer til det ”åbne” politis behov. Derudover vil der skulle skabes integrationer til de eksisterende datakilder i det ”åbne” politi samt til PET.</p>
<b>NUVÆRENDE FASE</b>	Realisering
<b>PROJEKTUDGIFTER</b>	<b>95,1 mio. kr.</b>
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↓ -4,9 mio. kr.
<b>PROJEKTAFSLUTNING</b>	<b>1. juli 2018</b>
AFVIGELSE IFT. BASELINE	6 måneder
<b>NETTONUTIDSVÆRDI</b>	<b>-56,9 mio. kr.</b>
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen
<b>IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER</b>	Projektet har seks ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.


PROJEKTETS  
NAVN

**POL-INTEL**

PROJEKTUDGIFTER

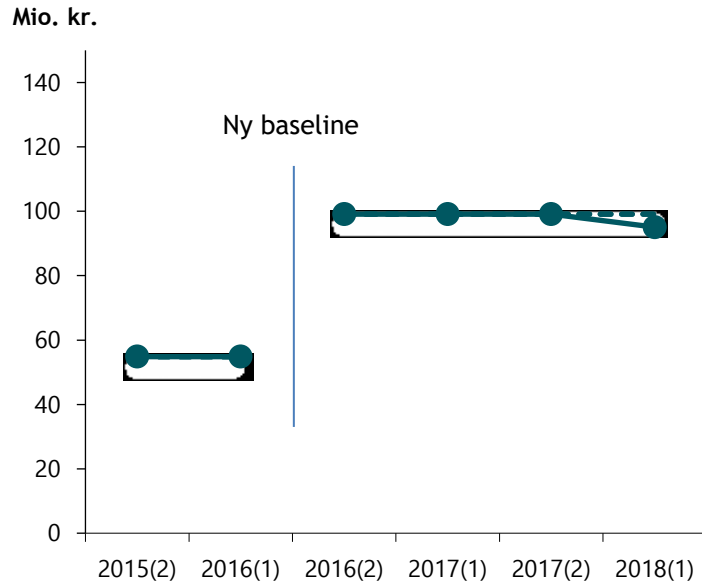

NETTONUTIDSVÆRDI

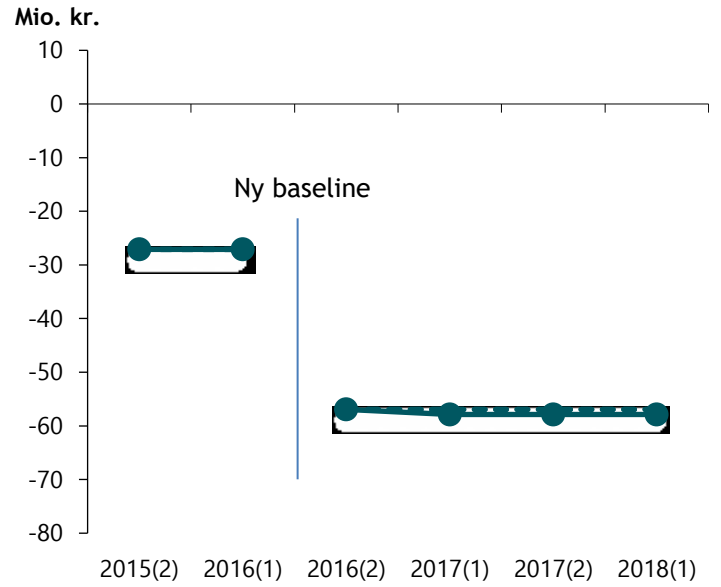



	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
<b>PROJEKT-AFSLUTNING</b>	-	01-07-2017	01-07-2018	01-01-2018 (ny baseline)	01-01-2018	15-03-2018	01-07-2018 (Afsluttet)	-
<b>HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS</b>	-	■	■	≡ (ny baseline)	■	■	Afsluttet	-

<b>PROJEKTETS NAVN</b>	<b>PLP-00 (It-understøttelse af plandata til ejendomsvurdering)</b>
<b>SAMLET TRAFIKLYS</b>	Afsluttet
<b>MYNDIGHED</b>	Erhvervsstyrelsen, Erhvervsministeriet
<b>PROJEKTETS FORMÅL</b>	Lovgivning
<b>BESKRIVELSE</b>	Der anskaffes en it-løsning til registrering og udstilling af oplysninger om anvendelses- og udnyttelsesmuligheder jf. plangrundlag (lokalplaner, kommuneplanrammer og landzonetilladelser), vejledede fortolket og registreret på jordstykkenniveau, og udstillet til offentligheden og til brug for ejendomsvurderingen i Skatteministeriet.
<b>NUVÆRENDE FASE</b>	Realisering
<b>PROJEKTUDGIFTER</b>	<b>38,9 mio. kr.</b>
AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑ 3 mio. kr.
<b>PROJEKTAFLUTNING</b>	<b>1. juli 2018</b>
AFVIGELSE IFT. BASELINE	3 måneder
<b>NETTONUTIDSVÆRDI</b>	<b>-35,3 mio. kr.</b>
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen
<b>IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER</b>	Projektet har ingen ikke-økonomiske gevinster.

PROJEKTETS NAVN **PLP-00 (It-understøttelse af plandata til ejendomsvurdering)**

PROJEKTUDGIFTER

NETTONUTIDSVÆRDI

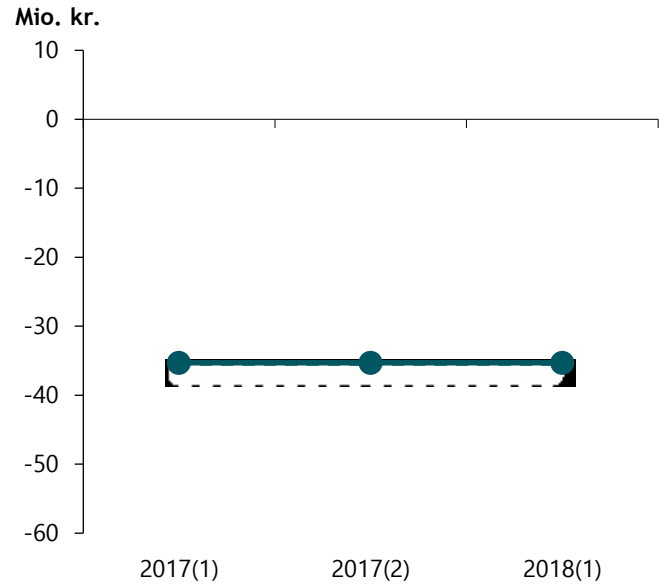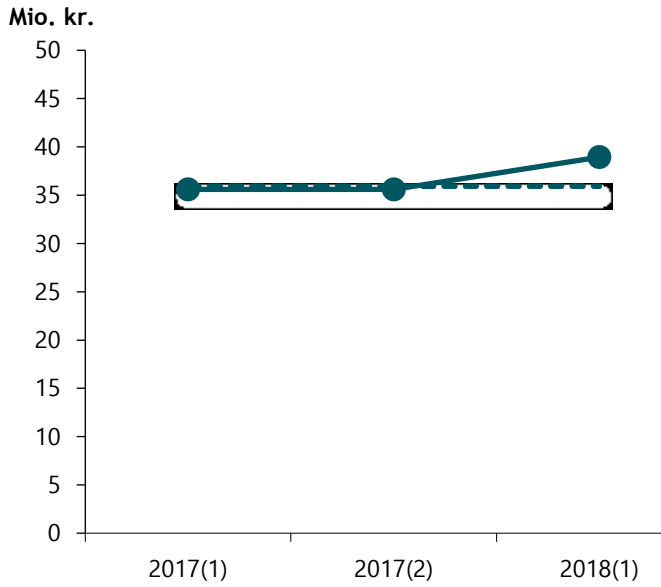

	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
<b>PROJEKT-AFSLUTNING</b>	-	-	-	-	31-03-2018	31-03-2018	01-07-2018 (Afsluttet)	-
<b>HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS</b>					■	■	Afsluttet	-

## PROJEKTETS NAVN

**Projekt Tidsstyring**

## SAMLET TRAFIKLYS



## MYNDIGHED

Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriet

## PROJEKTETS FORMÅL

Effektivisering

## BESKRIVELSE

Formålet med Projekt Tidsstyring og Forsvarsministeriets nye arbejdstidsregistrering for arbejdstid, ferie og friheder er effektivisering. Effektiviseringen skabes primært gennem en større anvendelse af SAP-standardløsninger på tværs af koncernen. Effektivisering sker gennem en medarbejder- og lederportal, hvor planlægning, registrering og opfølgning på arbejdstid kan ske gennem en automatisk og direkte dialog mellem chefer og medarbejdere. Anvendelsen af portalløsningen, automatisering af delprocesser samt en øget registreringshyppighed og godkendelse af arbejdstid vil medføre, at rapporteringen vil blive forbedret, og cheferne vil have et mere solidt og aktuelt styringsgrundlag.

Projektet er på pause, mens der gennemføres eksternt review, der skal belyse projektets videre proces. Efter aftale med It-rådet har projektet ikke statusrapporteret og fastholder det røde trafiklys fra seneste statusrapportering.

## NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

## PROJEKTUDGIFTER

**104,7 mio. kr.**

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

## PROJEKTAFLUTNING

**1. marts 2020**

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

## NETTONUTIDSVÆRDI

**-88,2 mio. kr.**

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER



Projektet har seks ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.

PROJEKTETS  
NAVN

## Projekt Tidsstyring

PROJEKTUDGIFTER

NETTONUTIDSVÆRDI

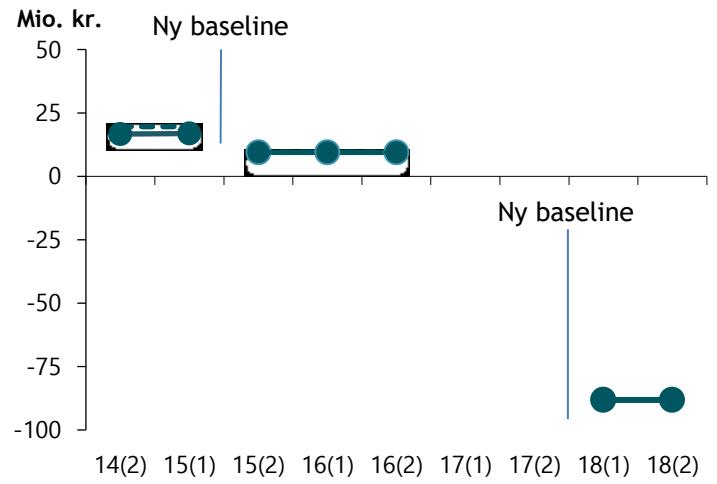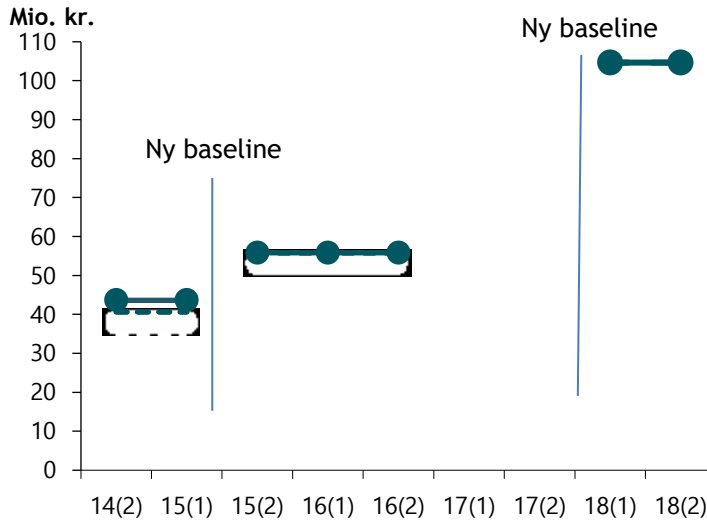

	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017	2018(1)	2018(2)
<b>PROJEKT-AFSLUTNING</b>	01-09-2016	01-09-2016	01-05-2017 (ny baseline)	01-05-2017	01-11-2017	Projekt under review i 2017	01-03-2020 (ny baseline)	01-03-2020
<b>HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS</b>	■	■	≡ (ny baseline)	■	■	■ (Rødt begge halvår)	≡ (ny baseline)	■



<b>PROJEKTETS NAVN</b>	<b>RejsUd</b>
<b>SAMLET TRAFIKLYS</b>	Afsluttet
<b>MYNDIGHED</b>	Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet
<b>PROJEKTETS FORMÅL</b>	Kvalitetsløft
<b>BESKRIVELSE</b>	Projektet skal sikre, at der efter et udbud vil være en systemunderstøttelse af udlægs- og rejseafregning for statslige institutioner og for institutioner i selvejesektoren, der fortsat vil have mulighed for at tilslutte sig løsningen.
<b>NUVÆRENDE FASE</b>	Realisering
<b>PROJEKTUDGIFTER</b> AFGIVELSE IFT. BASELINE	↑ <b>23,7 mio. kr.</b> 2 mio. kr.
<b>PROJEKTAFLUTNING</b> AFVIGELSE IFT. BASELINE	<b>1. juli 2018</b> 18 måneder
<b>NETTONUTIDSVÆRDI</b> AFVIGELSE IFT. BASELINE	↑ <b>-15,4 mio. kr.</b> 3 mio. kr.
<b>IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER</b>	Projektet har én ikke-økonomisk gevinst, der forventes høstet fuldt ud.

PROJEKTETS  
NAVN

RejsUd

PROJEKTUDGIFTER

NETTONUTIDSVÆRDI

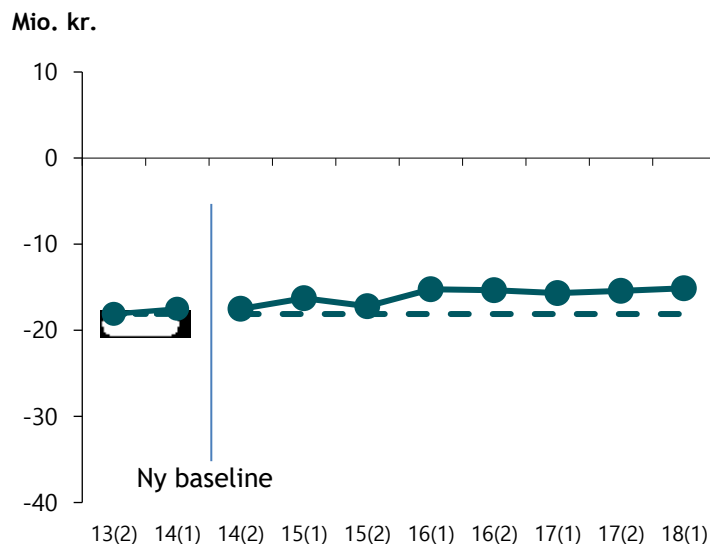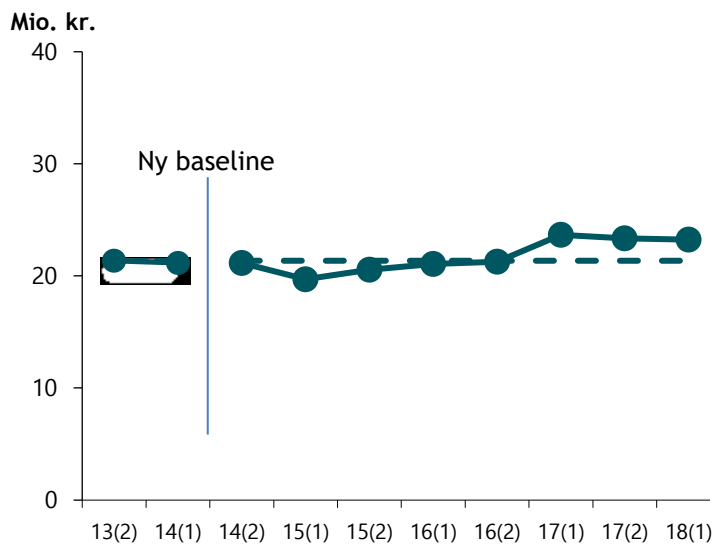

PROJEKT- AFSLUTNING	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)
	01-01-16 (baseline)	01-01-17	01-01-17 (ny baseline)	01-01-17	01-01-17	01-10-17	01-10-17	01-06-18	01-06-18	01-07-2018 (Afsluttet)

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2013(2)	2014(1)	2014(2)	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)
	■	■	■ (ny baseline)	■	■	■	■	■	■	Afsluttet



## PROJEKTETS NAVN

**SABA**

## SAMLET TRAFIKLYS



## MYNDIGHED

Naturstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet

## PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

## BESKRIVELSE

Projekt SABA gennemføres som et kvalitetsløftsprojekt med fokus på at fjerne de brændende platforme, som i dag udgør Naturstyrelsens (NST) systemunderstøttelse, og sikre at NST fremover har en løsning, der løbende kan udbygges, efterhånden som behovet opstår – eller som nye teknologiske muligheder giver potentiale for at effektivisere. Løsningen skal understøtte en række effektiviseringstiltag og omlægninger i forretningen. Disse er en del af et direktionsprojekt, der har det opdrag at implementere budgetanalysens krav til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen lukker desuden en række systemer ned, der i dag kører på hver sin server og har nogle forholdsvis store drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, og erstatter det med et system på en moderne platform.

## NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

## PROJEKTUDGIFTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**30,9 mio. kr.**

3,4 mio. kr.



## PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**1. juni 2019**

6 måneder



## NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**-13,9 mio. kr.**


1,8 mio. kr.

IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER


Projektet har tre ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.

PROJEKTETS NAVN **SABA**

PROJEKTUDGIFTER

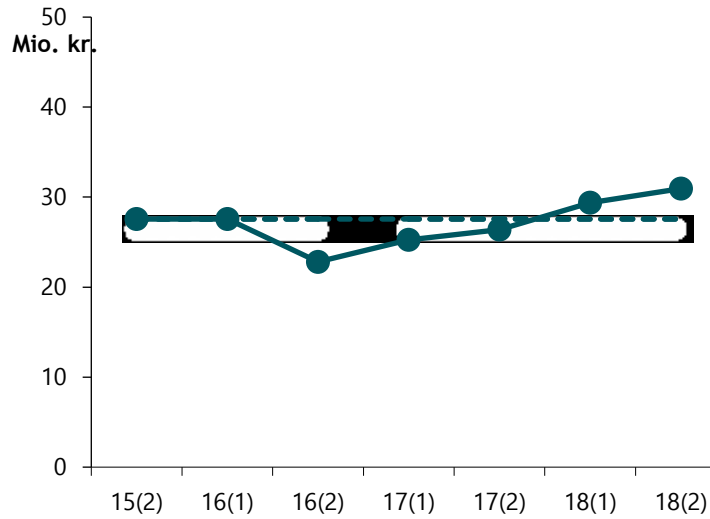

NETTONUTIDSVÆRDI

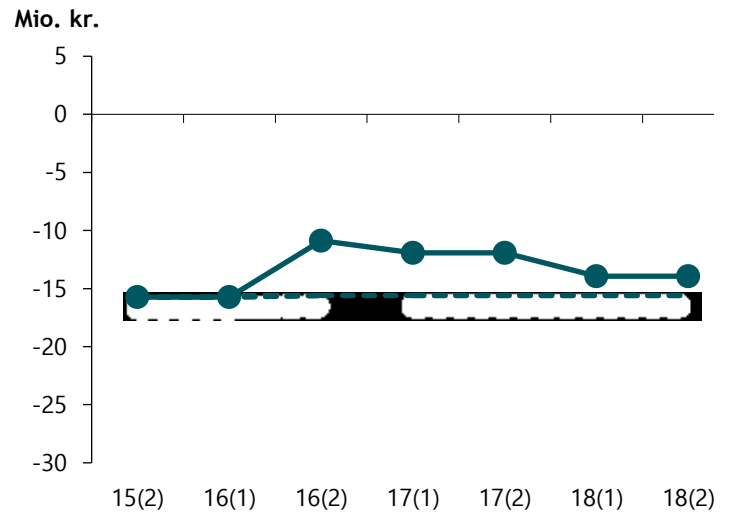

PROJEKT-AFSLUTNING	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	-	01-01-2019 (baseline)	01-01-2019	01-01-2019	01-01-2019	01-01-2019	01-01-2019	01-06-2019

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	-	■	■	■	■	■	■	■

**PROJEKTETS NAVN**

**SAP38**

**SAMLET TRAFIKLYS**

Lukket før tid

**MYNDIGHED**

Udviklings- og Foreklingsstyrelsen, Skatteministeriet

**PROJEKTETS FORMÅL**

Lovgivningsprojekt

**BESKRIVELSE**

Hovedformålet er at sikre hurtig og sikker tilkobling til det nye inddrivelsessystem (NyMF/PSRM) for Skattekontoen, uden at bringe driftsstabiliteten i fare. Projektet vil udelukkende sikre, at gøre det muligt for Skattekontoen, at levere ubetalte krav (fordringer) til inddrivelse på den måde, som Gældsstyrelsen ønsker fordringerne leveret fremadrettet.


<b>PROJEKTETS NAVN</b>	<b>SARA (Fælles museums-it)</b>
<b>SAMLET TRAFIKLYS</b>	
<b>MYNDIGHED</b>	Slots- og Kulturstyrelsen, Kulturministeriet
<b>PROJEKTETS FORMÅL</b>	Kvalitetsløft
<b>BESKRIVELSE</b>	SARA er et infrastrukturprojekt til de danske statslige og statsanerkendte museer i form af et nyt fælles informationssystem til registrering og håndtering af samlinger, genstande og kunstværker. Systemet afløser en række forskellige og overvejende ældre databaser.
<b>NUVÆRENDE FASE</b>	Gennemførelse
<b>PROJEKTUDGIFTER</b>	<b>29,5 mio. kr.</b>
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen 
<b>PROJEKTAFLUTNING</b>	<b>31. december 2019</b>
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen 
<b>NETTONUTIDSVÆRDI</b>	<b>1,3 mio. kr.</b>
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen 
<b>IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER</b>	Projektet har otte ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.

PROJEKTETS  
NAVN

## SARA (Fælles museums-it)


PROJEKTUDGIFTER

Mio. kr.

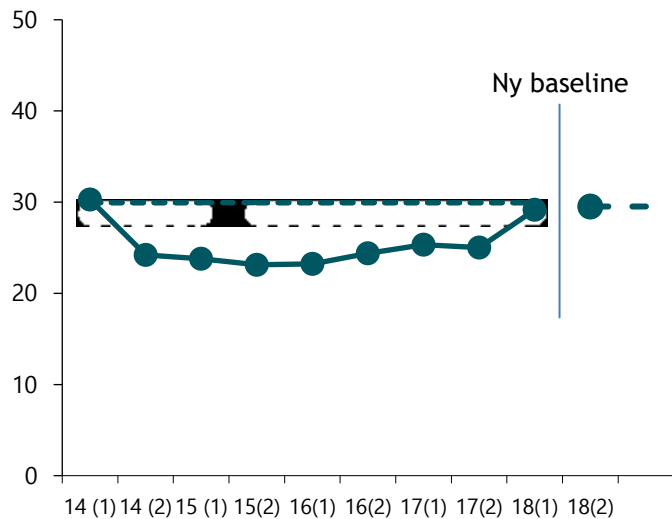

NETTONUTIDSVÆRDI

Mio. kr.

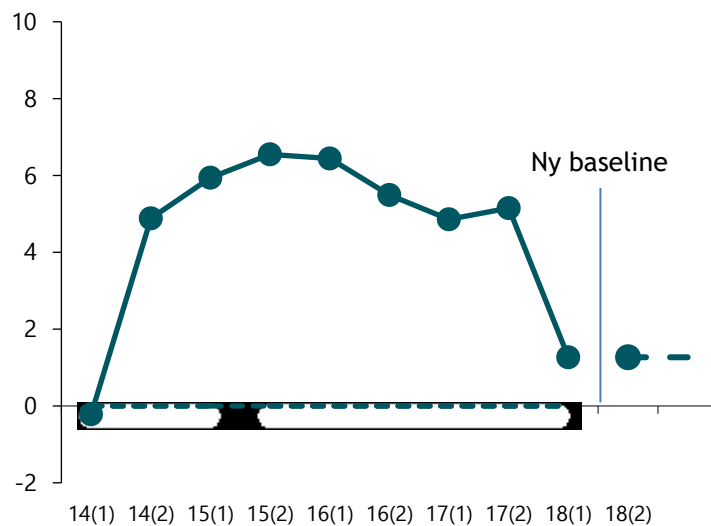

PROJEKT- AFSLUTNING	2014(1)	2014(2)	2015	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	01-10-2018 (baseline)	30-06-2017	30-06-2017	30-06-2017	31-12-2017	30-06-2018	31-12-2018	30-06-2019	31-12-2019 (ny baseline)

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2014(1)	2014(2)	2015	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(1)
	■	■	■	■	■	■	■	■	■ (ny baseline)

## PROJEKTETS NAVN

## Skattekontoen tilslutning til inddrivelse

## SAMLET TRAFIKLYS



## MYNDIGHED

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Skatteministeriet

## PROJEKTETS FORMÅL

Lovgivning

## BESKRIVELSE

At skabe forudsætninger for, at SKAT kan levere fordringer til Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem fra fagsystemet Skattekontoen (SKO).

## NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

## PROJEKTUDGIFTER

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**45,6 mio. kr.**

2,8 mio. kr.



## PROJEKTAFLUTNING

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**15. juli 2019**

Ingen



## NETTONUTIDSVÆRDI

AFVIGELSE IFT. BASELINE

**-68,7 mio. kr.**

-2,5 mio. kr.

IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER

Projektet har ingen ikke-økonomiske gevinster, men understøtter ICI i at realisere sine gevinster.


PROJEKTETS  
NAVN

## Skattekontoen tilslutning til inddrivelse


PROJEKTUDGIFTER

NETTONUTIDSVÆRDI

Mio. kr.

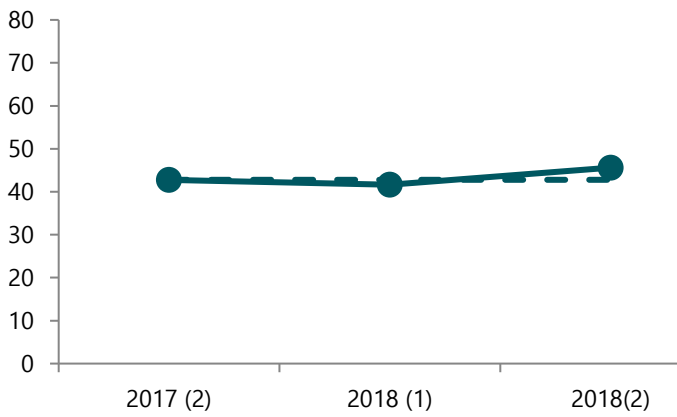

Mio. kr.

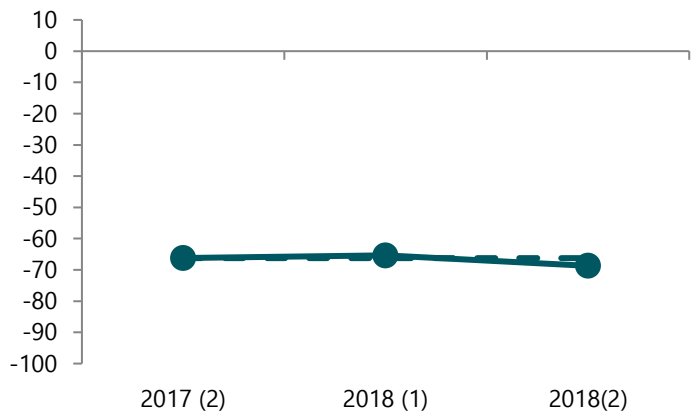

PROJEKT-  
AFSLUTNING

	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	-	-	-	-	-	15-07-2019	15-07-2019	15-07-2019

HISTORISKE  
SAMLEDE  
TRAFIKLYS

	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	-	-	-	-	-	■	■	■


<b>PROJEKTETS NAVN</b>	<b>Statens budgetsystem (tidl. Fællesstatsligt budgetsystem)</b>	
<b>SAMLET TRAFIKLYS</b>		
<b>MYNDIGHED</b>	Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet	
<b>PROJEKTETS FORMÅL</b>	Kvalitetsløft	
<b>BESKRIVELSE</b>	<p>Projektet skal skabe et fællesstatsligt system til at varetage opgaverne omkring budgetlægning og -opfølgning i alle statslige institutioner. Derudover skal systemet understøtte ministeriernes koncernstyring. Projektet vil omhandle anskaffelse af et standardsystem samt konsulentassistance til at foretage tilpasninger af pågældende standardsystem samt at understøtte en implementering i alle statens institutioner.</p>	
<b>NUVÆRENDE FASE</b>	Gennemførelse	
<b>PROJEKTUDGIFTER</b>	<b>85,7 mio. kr.</b>	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen 	
<b>PROJEKTAFSLUTNING</b>	<b>25. marts 2020</b>	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen 	
<b>NETTONUTIDSVÆRDI</b>	<b>20,2 mio. kr.</b>	
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen 	
<b>IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER</b>	Projektet har tre ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.	




PROJEKTETS  
NAVN

## Statens budgetsystem (tidl. Fællesstatsligt budgetsystem)

PROJEKTUDGIFTER

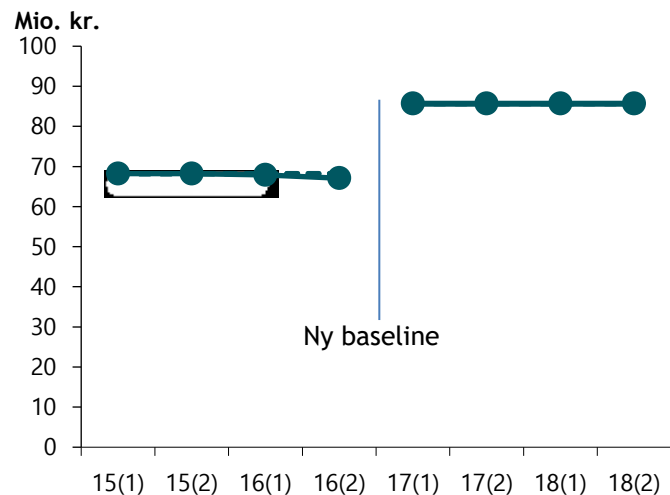



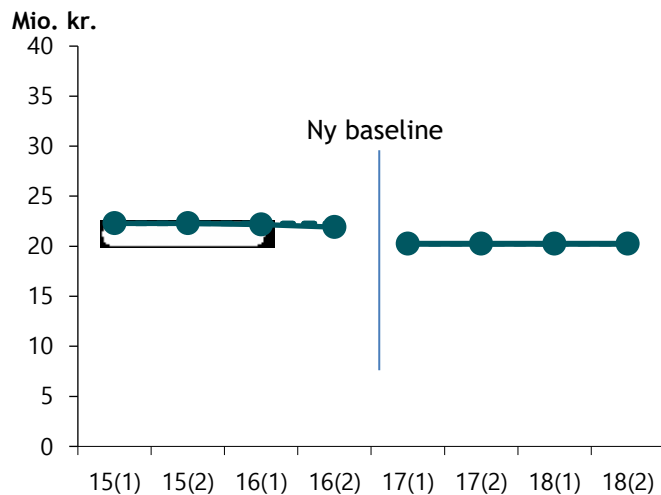

NETTONUTIDSVÆRDI



PROJEKT- AFSLUTNING	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	01-08-2019	01-08-2019	01-08-2019	01-08-2019	25-03-2020	25-03-2020	25-03-2020	25-03-2020
	(baseline)				(ny baseline)			

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	■	■	■	■	■	■	■	■
	(baseline)				(ny baseline)			

PROJEKTETS NAVN	<b>Udveksling af data om nedgravet infrastruktur (LER)</b>
SAMLET TRAFIKLYS	
MYNDIGHED	Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
PROJEKTETS FORMÅL	Effektivisering
BESKRIVELSE	<p>Projektet har til formål at videreudvikle det eksisterende ledningsejerregister (LER) til en digital infrastruktur for udveksling af standardiserede ledningsoplysninger. Ledningsejerne vil sende standardiserede og digitaliserede oplysninger til LER, som samler og videresender til graveaktørerne, hvilket giver mulighed for automatisering og mere effektive arbejdsgange hos disse og derigennem færre graveskader. Endvidere er formålet at fremme øget samgravning og samføring, så færre gravearbejder mindsker gener for trafikken og problemer med vedligeholdelsen af vores veje. Projektet bidrager således til at gøre det lettere at finde ledig kapacitet i føringsrør til samføring af ledninger samt understøtter regeringens strategi om udrulning af bredbånd til hele Danmark.</p>
NUVÆRENDE FASE	Anskaffelse
PROJEKTUDGIFTER	<b>Fortroligt pga. udbud</b>
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen 
PROJEKTAFLUTNING	<b>31. december 2020</b>
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen 
NETTONUTIDSVÆRDI	<b>Fortroligt pga. udbud</b>
AFVIGELSE IFT. BASELINE	Ingen 
IKKE-ØKONOMISKE GEVINSTER	Projektet har to ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.

## PROJEKTETS NAVN

Vanda

## SAMLET TRAFIKLYS



## MYNDIGHED

Danmarks Miljøportal, Miljø- og Fødevareministeriet

## PROJEKTETS FORMÅL

Kvalitetsløft

## BESKRIVELSE

Formålet med projektet er at erstatte forældede systemer og databaser med et nyt fælles tidssvarende fagsystem. Endvidere er projektet en forudsætning for at kunne forbedre datagrundlaget på overfladevandsområdet på tværs af Danmarks Miljøportals parter og sikre offentlig adgang til disse data via fællesoffentlige datastandarder og begrebsmodeller. Det primære formål med projektet er således, i It-projektmodellens forstand, relateret til et kvalitetsløft i datakvalitet for Danmarks Miljøportals parter. Formålet er på et strategisk niveau at sikre kvalitetsfyldte beslutninger i forhold til større politiske initiativer og satsninger omkring overfladevand i Danmark, men også som input i forhold til afrapportering til EU.

## NUVÆRENDE FASE

Gennemførelse

## PROJEKTUDGIFTER

49,2 mio. kr.

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

## PROJEKTAFLUTNING

1. januar 2021

## AFVIGELSE IFT. BASELINE

Ingen 

## NETTONUTIDSVÆRDI

-54,3 mio. kr.

## AFVIGELSE IFT. BASELINE


Ingen IKKE-ØKONOMISKE  
GEVINSTER

Projektet har seks ikke-økonomiske gevinster, som alle forventes høstet fuldt ud.


PROJEKTETS  
NAVN

Vanda

PROJEKTUDGIFTER

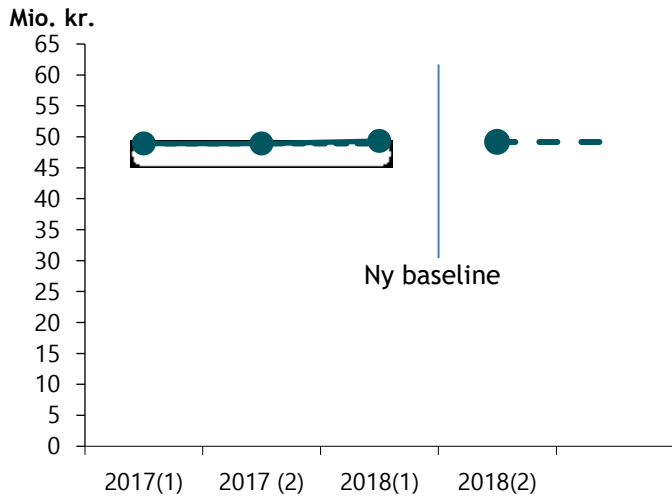

NETTONUTIDSVÆRDI

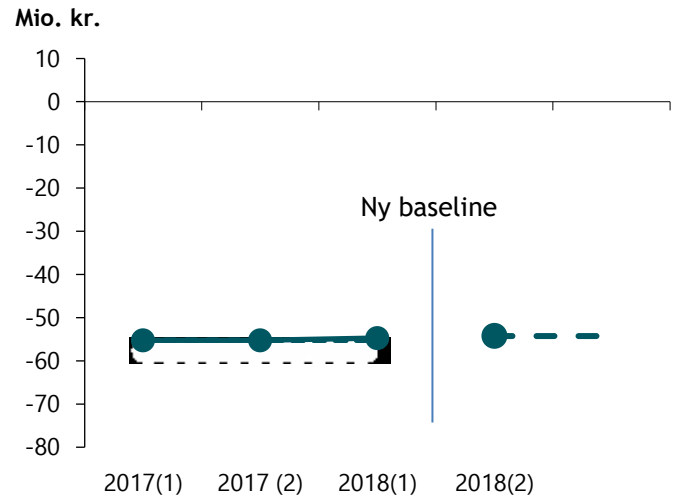

PROJEKT- AFSLUTNING	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	-	-	-	-	01-01-2020	01-01-2020	01-01-2021	01-01-2021 (ny baseline)

HISTORISKE SAMLEDE TRAFIKLYS	2015(1)	2015(2)	2016(1)	2016(2)	2017(1)	2017(2)	2018(1)	2018(2)
	-	-	-	-	■	■	■	■ (ny baseline)



